

Comune di TORINO  
Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori  
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE.

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** SMI "Morelli" – Via Cecchi 18 Torino ToSMI "Matteotti" \_ C.so Sicilia 40 Torino ToSMI "Martiri del Martinetto" – Str.S. Mauro 24 Torino ToSMI "Drovetti" – Via Bardonecchia 34 Torino ToSEL "Rignon" \_Via Massena 39 Torino ToSEL "Alfieri" \_Via Palmieri 58 Torino ToSMA Via Varallo 33 Torino To, TORINO (TO)

TORINO, li 15/11/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(Responsabile Tecnico La Malfa Geom. Angelo)

IL COMMITTENTE  
(DIRETTORE GENERALE VICARIO INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. 11/04/00 N. MECC. 0002832/29 VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI – AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT Quirico Ing. Gianbattista)

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

Responsabile Tecnico La Malfa Geom. Angelo  
Via Bazzi, 4  
10152 Torino (To)  
0114426051 - 0114426177  
angelo.lamalfa@comune.torino.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>SMI - VIA CECCHI 18</b>						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	1	E	3	6	01/06/2011	06/06/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	4	07/06/2011	10/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	5	5	13/06/2011	17/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	3	3	20/06/2011	22/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	23/06/2011	24/06/2011
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	27/06/2011	01/07/2011
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	5	5	04/07/2011	08/07/2011
Formazione di massetto per esterni	1	E	10	12	11/07/2011	22/07/2011
Posa di pavimenti per esterni	1	E	15	19	25/07/2011	12/08/2011
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	7	16/08/2011	22/08/2011
Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	1	E	2	2	23/08/2011	24/08/2011
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	1	E	2	2	25/08/2011	26/08/2011
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	29/08/2011	30/08/2011
<b>SMI - "MATTEOTTI" CORSO SICILIA 40</b>						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	2	E	3	3	07/09/2011	09/09/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	4	4	12/09/2011	15/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	5	7	16/09/2011	22/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	2	E	3	5	23/09/2011	27/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	2	2	28/09/2011	29/09/2011
Scavo a sezione obbligata	2	E	5	7	30/09/2011	06/10/2011
Cordoli, zanelle e opere d'arte	2	E	5	7	07/10/2011	13/10/2011
Formazione di massetto per esterni	2	E	10	14	14/10/2011	27/10/2011
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	3	3	02/11/2011	04/11/2011
Posa di pavimenti per esterni	2	E	10	12	07/11/2011	18/11/2011
Tinteggiatura di superfici esterne	2	E	5	5	21/11/2011	25/11/2011

Tabella Analitica Gantt

Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	2	E	2	2	28/11/2011	29/11/2011
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	2	E	2	2	30/11/2011	01/12/2011
Smobilizzo del cantiere	2	E	2	4	02/12/2011	05/12/2011
SMI - "MARTIRI DEL MARTINETTO" STRADA SAN MAURO 24						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	3	E	3	3	12/12/2011	14/12/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	E	2	2	15/12/2011	16/12/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	E	2	2	19/12/2011	20/12/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	3	E	2	2	21/12/2011	22/12/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	E	2	5	23/12/2011	27/12/2011
Scavo a sezione obbligata	3	E	5	7	28/12/2011	03/01/2012
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3	E	5	8	04/01/2012	11/01/2012
Formazione di massetto per esterni	3	E	7	9	12/01/2012	20/01/2012
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	3	3	23/01/2012	25/01/2012
Posa di pavimenti per esterni	3	E	10	14	26/01/2012	08/02/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	3	E	5	7	09/02/2012	15/02/2012
Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	3	E	2	2	16/02/2012	17/02/2012
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	3	E	2	2	20/02/2012	21/02/2012
Formazione di tappeto erboso	3	E	1	1	22/02/2012	22/02/2012
Smobilizzo del cantiere	3	E	2	2	23/02/2012	24/02/2012
SMI - "DROVETTI" VIA BARDONECCHIA 34						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	4	E	3	5	01/03/2012	05/03/2012
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4	E	2	2	06/03/2012	07/03/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4	E	2	2	08/03/2012	09/03/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	4	E	2	2	12/03/2012	13/03/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4	E	2	2	14/03/2012	15/03/2012
Scavo a sezione obbligata	4	E	5	7	16/03/2012	22/03/2012
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4	E	5	7	23/03/2012	29/03/2012
Formazione di massetto per esterni	4	E	7	12	30/03/2012	10/04/2012
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	3	3	11/04/2012	13/04/2012
Posa di pavimenti per esterni	4	E	10	15	16/04/2012	30/04/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	4	E	5	7	02/05/2012	08/05/2012

Tabella Analitica Gantt

Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	4	E	2	2	09/05/2012	10/05/2012
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	4	E	2	4	11/05/2012	14/05/2012
Formazione di tappeto erboso	4	E	1	1	15/05/2012	15/05/2012
Smobilizzo del cantiere	4	E	2	2	16/05/2012	17/05/2012
SEL- "RIGNON" VIA MASSENA 39						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	5	E	3	3	04/06/2012	06/06/2012
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	E	2	2	07/06/2012	08/06/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	E	2	2	11/06/2012	12/06/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	5	E	2	2	13/06/2012	14/06/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5	E	2	4	15/06/2012	18/06/2012
Scavo a sezione obbligata	5	E	5	7	19/06/2012	25/06/2012
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5	E	5	7	26/06/2012	02/07/2012
Formazione di massetto per esterni	5	E	7	9	03/07/2012	11/07/2012
Formazione di manto di usura e collegamento	5	E	3	5	12/07/2012	16/07/2012
Posa di pavimenti per esterni	5	E	10	14	17/07/2012	30/07/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	5	E	5	7	31/07/2012	06/08/2012
Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	5	E	2	2	07/08/2012	08/08/2012
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	5	E	2	2	09/08/2012	10/08/2012
Formazione di tappeto erboso	5	E	1	1	13/08/2012	13/08/2012
Smobilizzo del cantiere	5	E	2	3	14/08/2012	16/08/2012
SEL- "ALFIERI" VIA PALMIERI 58						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	6	E	3	3	20/08/2012	22/08/2012
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6	E	2	2	23/08/2012	24/08/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	6	E	2	2	27/08/2012	28/08/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	6	E	2	2	29/08/2012	30/08/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	6	E	2	4	31/08/2012	03/09/2012
Scavo a sezione obbligata	6	E	5	7	04/09/2012	10/09/2012
Cordoli, zanelle e opere d'arte	6	E	5	7	11/09/2012	17/09/2012
Formazione di massetto per esterni	6	E	7	9	18/09/2012	26/09/2012
Formazione di manto di usura e collegamento	6	E	3	5	27/09/2012	01/10/2012
Posa di pavimenti per esterni	6	E	10	14	02/10/2012	15/10/2012

Tabella Analitica Gantt

Tinteggiatura di superfici esterne	6	E	5	7	16/10/2012	22/10/2012
Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	6	E	2	2	23/10/2012	24/10/2012
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	6	E	2	2	25/10/2012	26/10/2012
Formazione di tappeto erboso	6	E	1	1	29/10/2012	29/10/2012
Smobilizzo del cantiere	6	E	2	2	30/10/2012	31/10/2012
SMA- VIA VARALLO 33						
Sgombero dei materiali depositati dall'area di lavorazione	7	E	3	5	07/09/2012	11/09/2012
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7	E	2	2	12/09/2012	13/09/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	7	E	2	4	14/09/2012	17/09/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	7	E	2	2	18/09/2012	19/09/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	7	E	2	2	20/09/2012	21/09/2012
Scavo a sezione obbligata	7	E	5	5	24/09/2012	28/09/2012
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7	E	5	5	01/10/2012	05/10/2012
Formazione di massetto per esterni	7	E	7	9	08/10/2012	16/10/2012
Formazione di manto di usura e collegamento	7	E	3	3	17/10/2012	19/10/2012
Posa di pavimenti per esterni	7	E	10	15	22/10/2012	05/11/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	7	E	5	7	06/11/2012	12/11/2012
Tracciamento campi per gioco sportivi e ludici	7	E	2	2	13/11/2012	14/11/2012
montaggio delle attrezzature ludiche e sportive	7	E	2	2	15/11/2012	16/11/2012
Formazione di tappeto erboso	7	E	1	1	19/11/2012	19/11/2012
Smobilizzo del cantiere	7	E	2	2	20/11/2012	21/11/2012

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = Matteotti
- 3) = Martiri del Martinetto
- 4) = drovetti
- 5) = Rignon

6) = Alfieri

7) = Varallo

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro








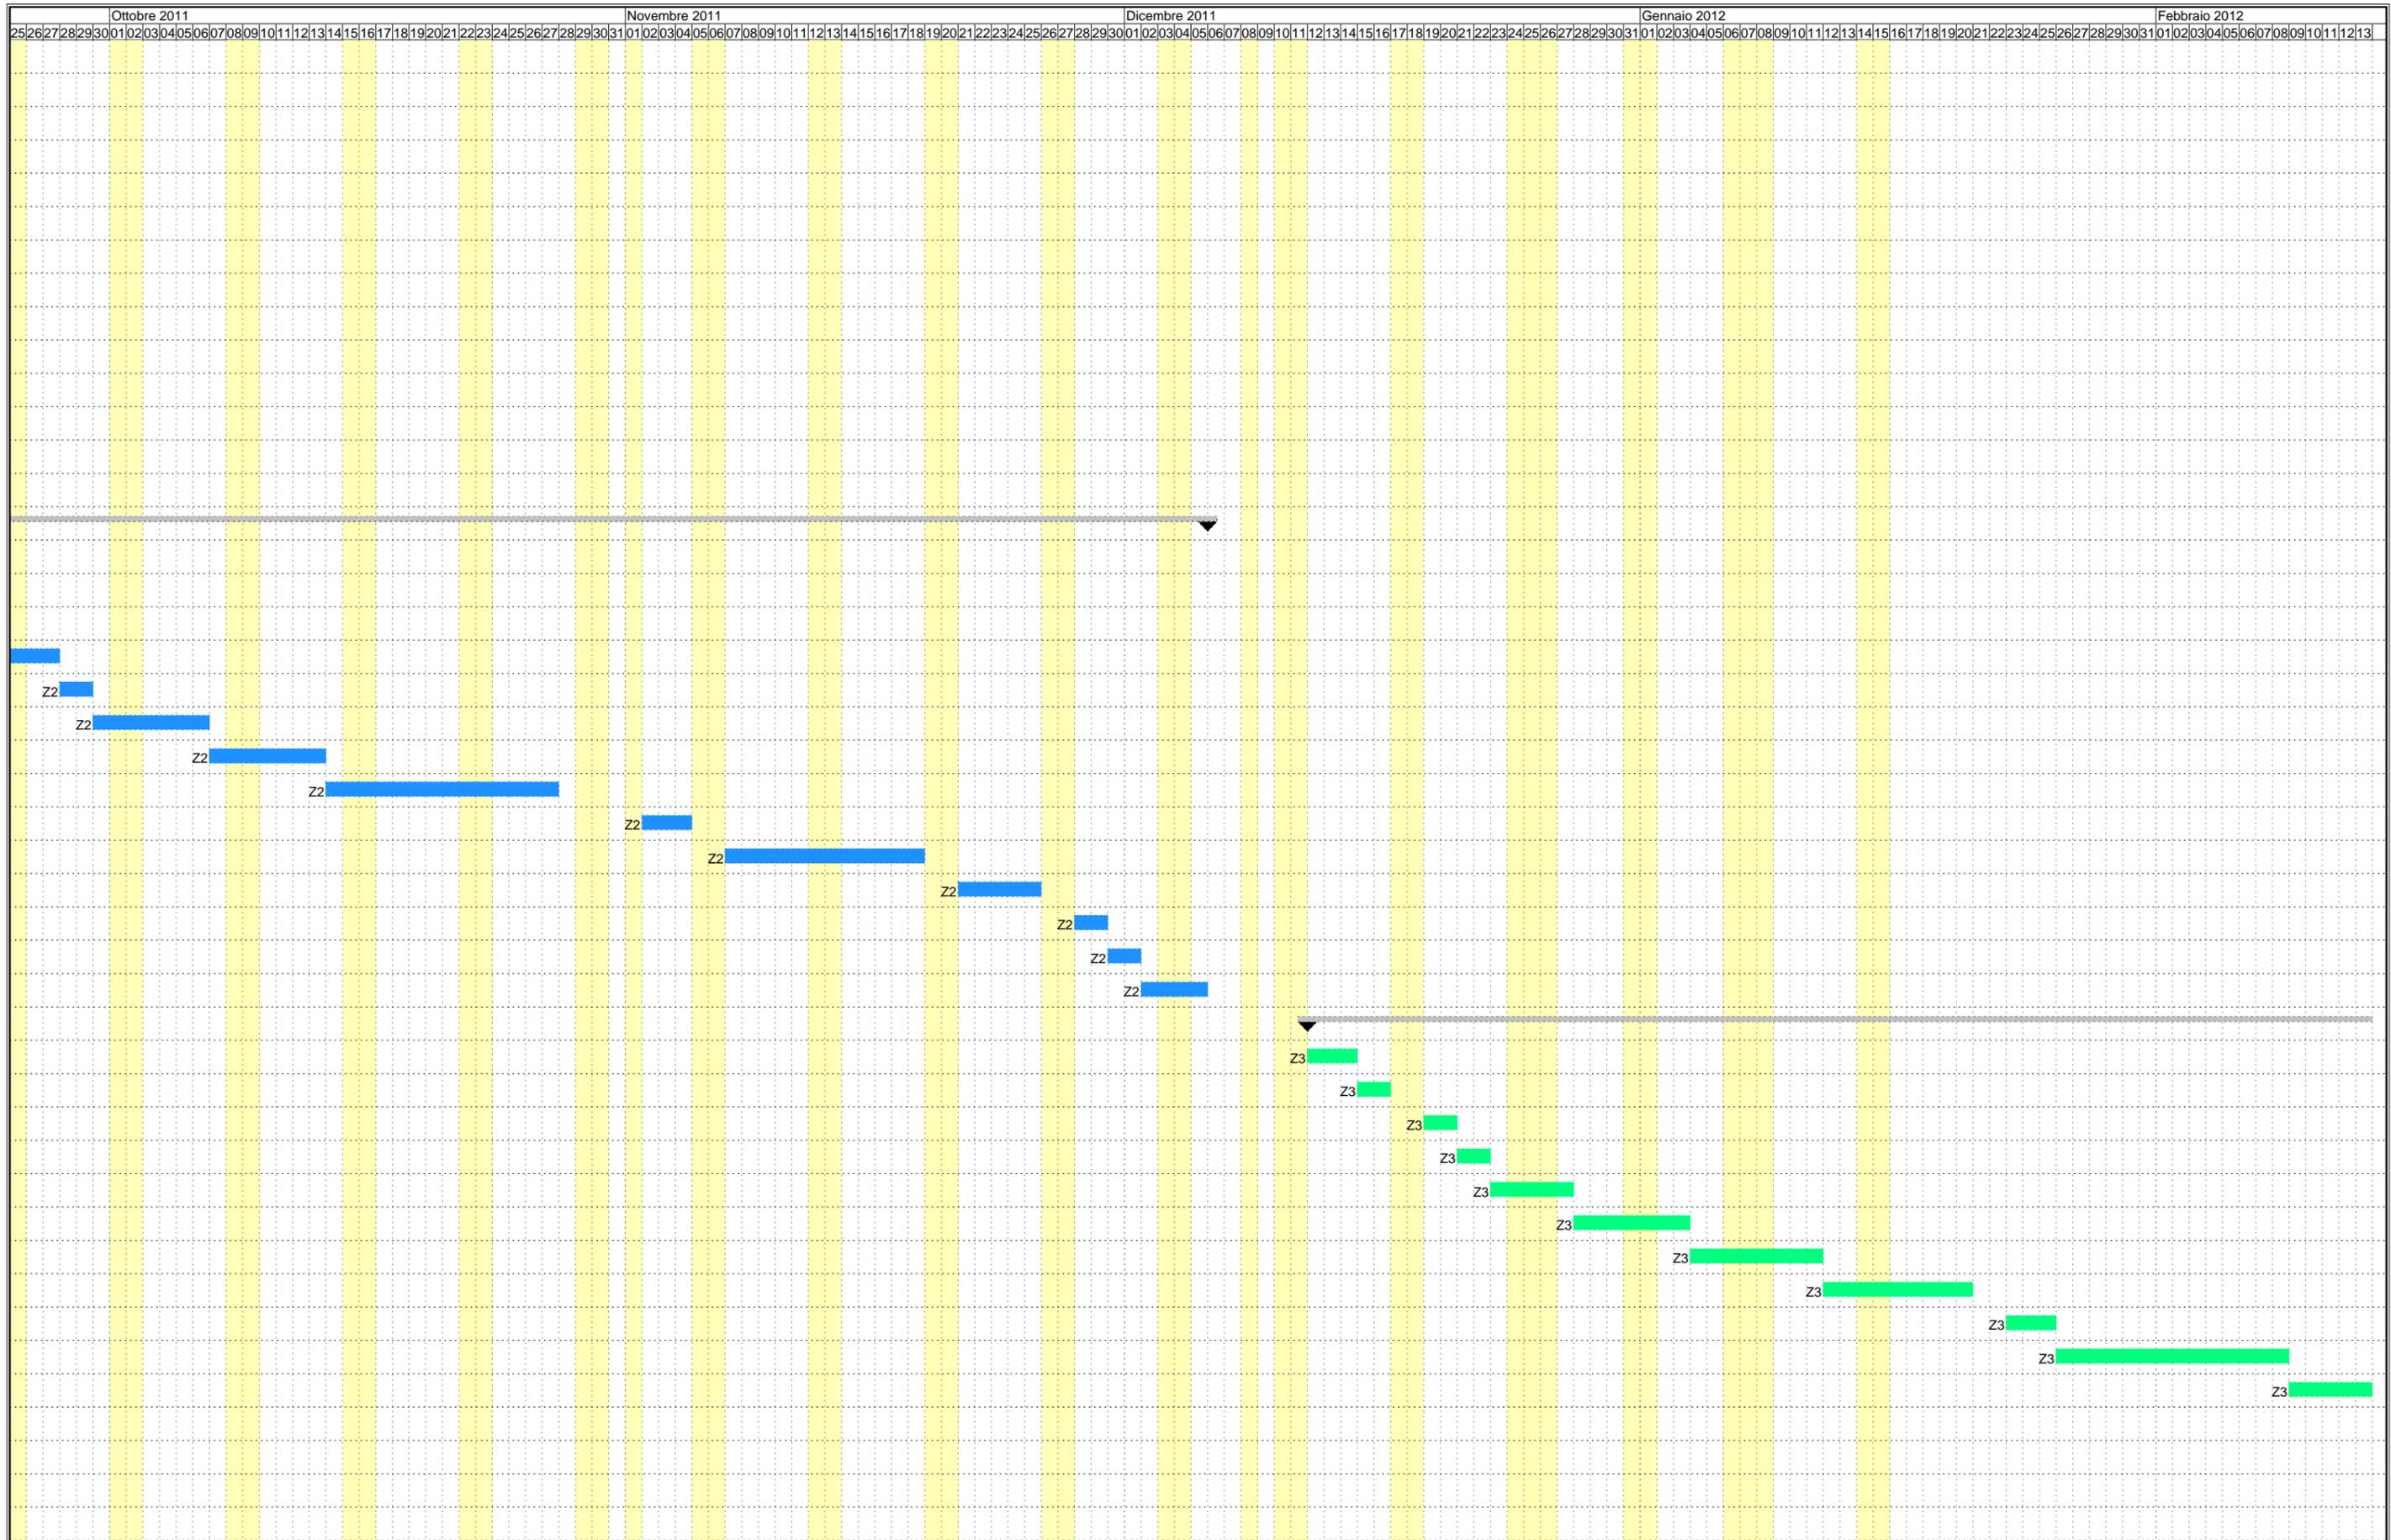



A calendar grid for the months of October 2011, November 2011, December 2011, January 2012, and February 2012. The grid consists of 60 columns (5 days per month) and 42 rows (7 weeks per month). The header row shows the month and day of the week for each day. The entire grid area is filled with a light yellow color and a dotted grid pattern.

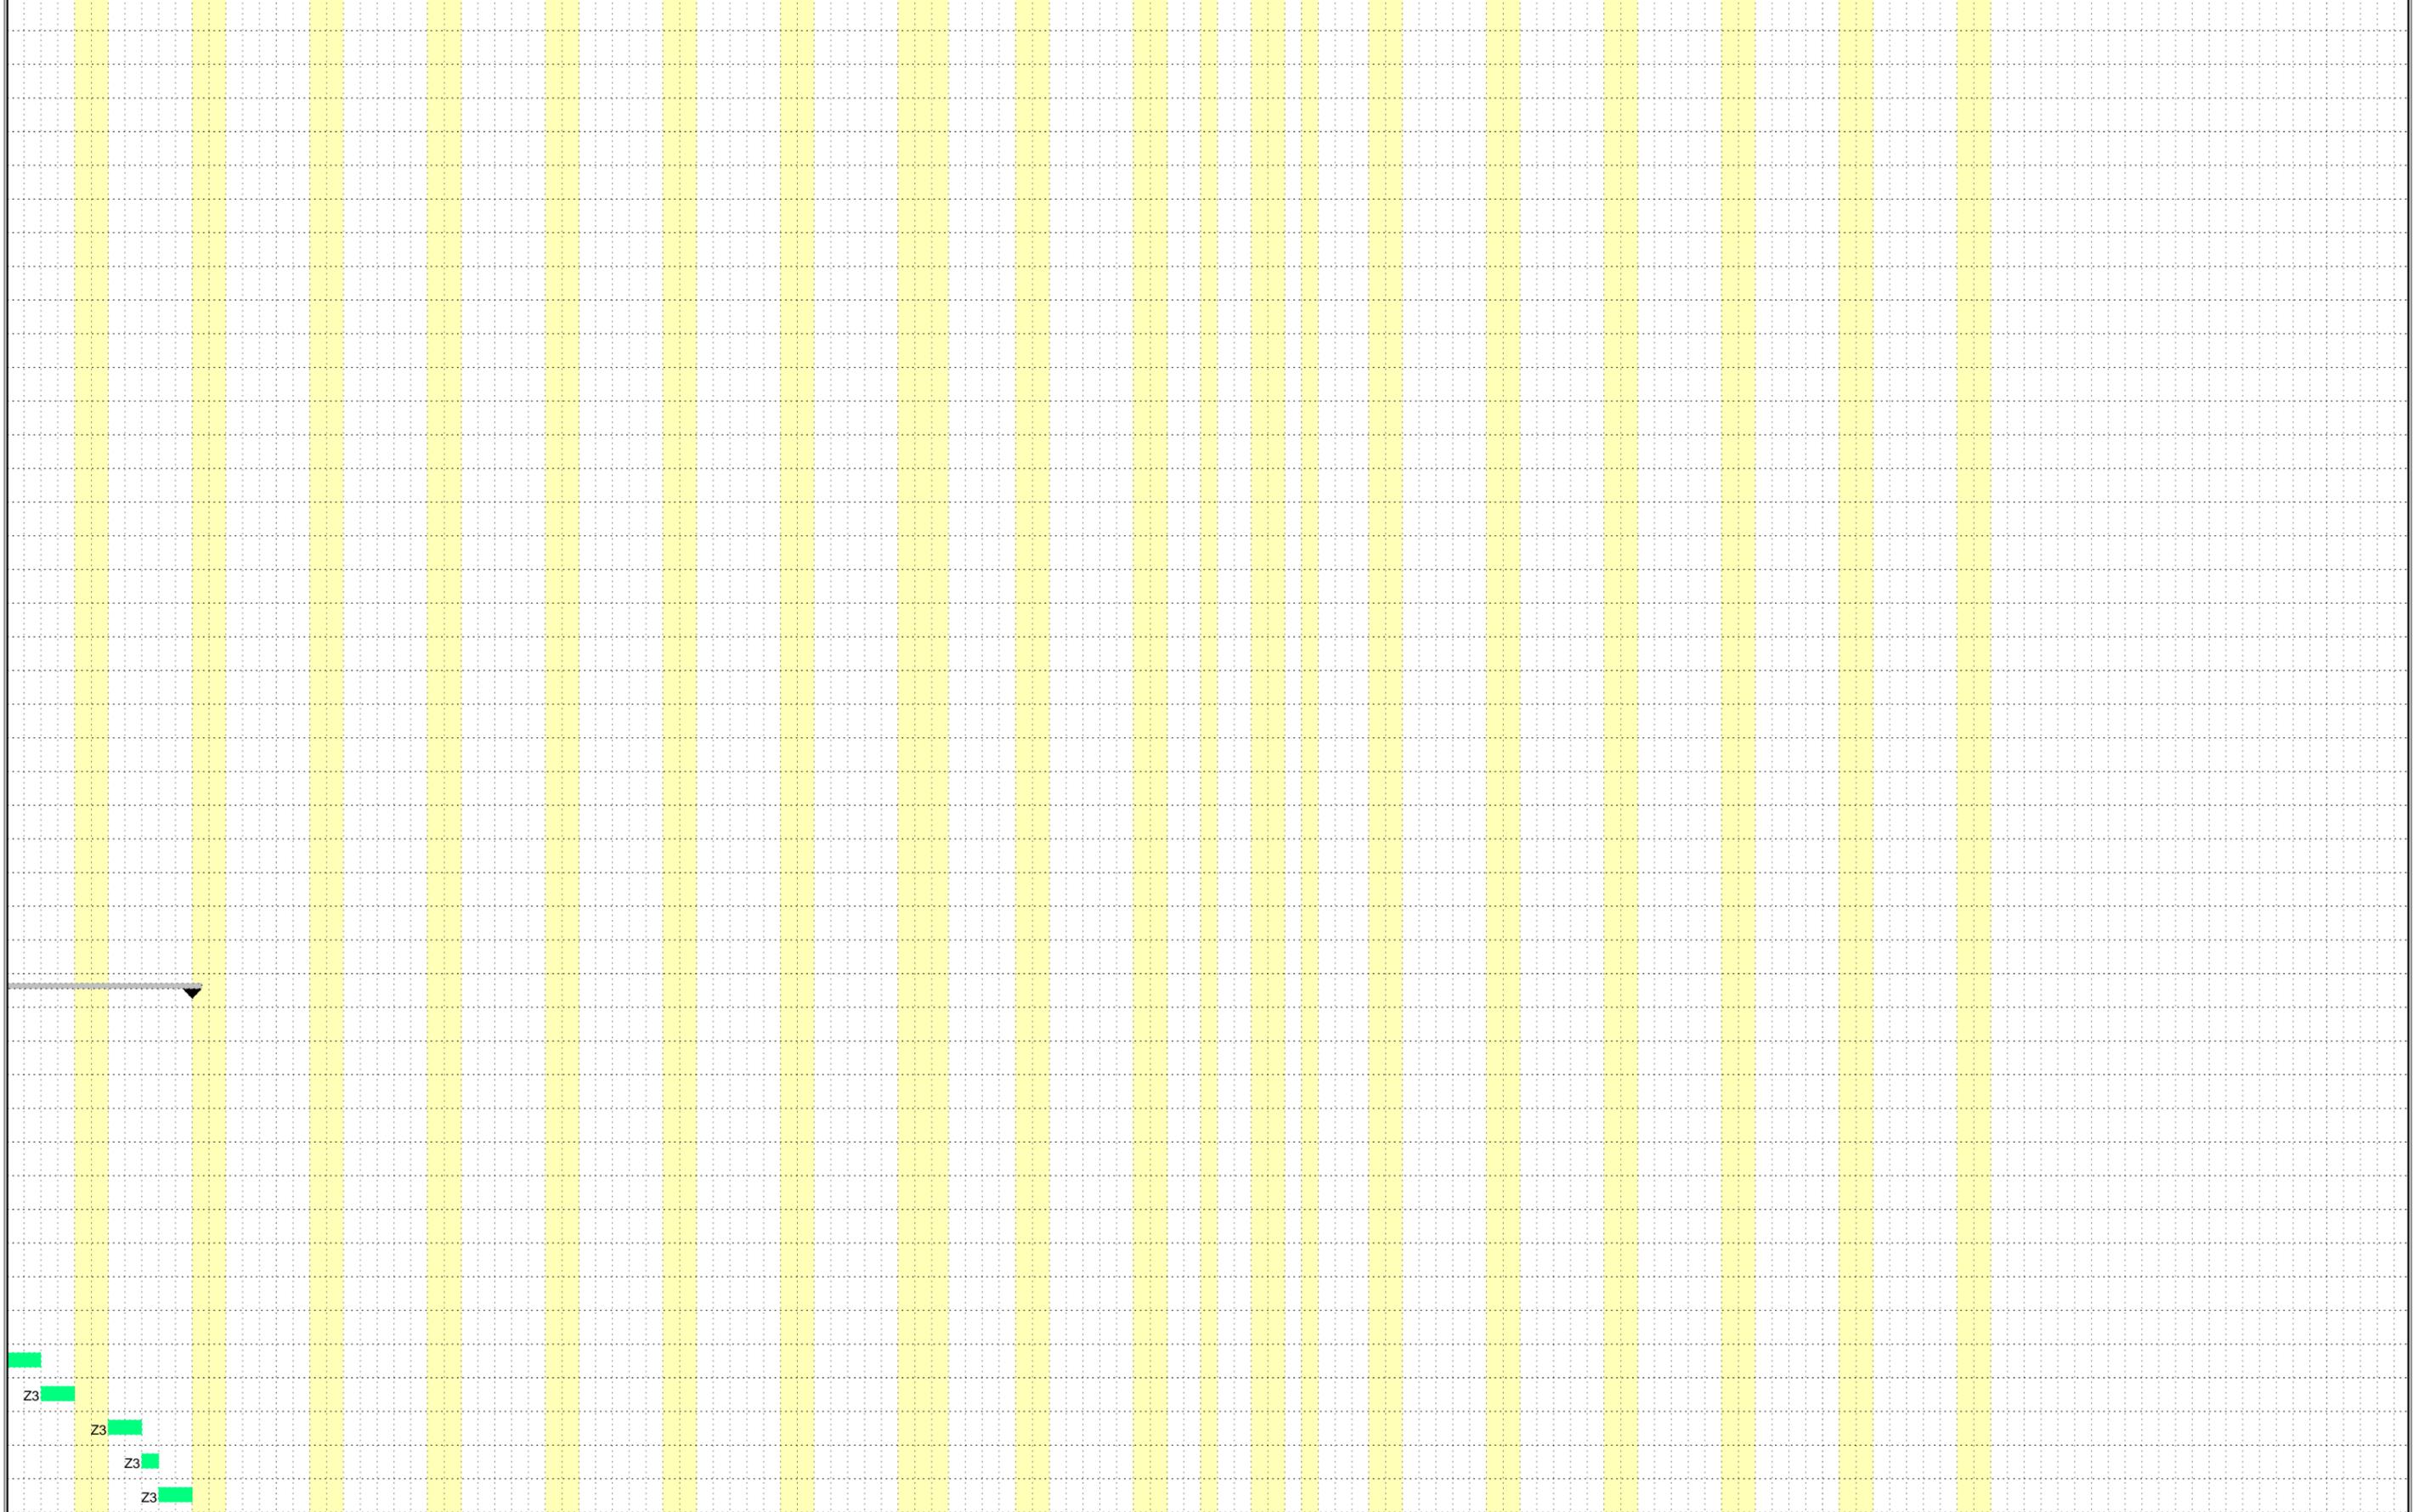



Marzo 2012											Aprile 2012											Maggio 2012											Giugno 2012											Luglio 2012																																																																					
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04
Gantt chart area with vertical bars and a dotted grid.																																																																																																																	





