

ALLEGATO "A"

Comune di Torino
Provincia di To

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: SOSTITUZIONE PARZIALE PARETI MOBILI PREFABBRICATE E POSIZIONAMENTO
RETE DI PROTEZIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: via Mosca, 11, Torino (To)

Torino, l 20/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA
VIA BAZZI, 4
10152 TORINO (TO)
0114426071 - 0114426177

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	3		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	3		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1		
Compartimentazione cantiere	1	E	2	2		
Rimozione di serramenti esterni	1	E	4	6		
Rimozione di pareti mobili in pannelli prefabbricati	1	E	6	8		
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata	1	E	7	9		
Posa di serramenti esterni	1	E	5	5		
Montaggio di rete aerea agganciata a tiranti in acciaio ancorati alle murature	1	E	4	4		
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settim				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g		Z1													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1													
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g							Z1								
Compartimentazione cantiere	2 g								Z1							
Rimozione di serramenti esterni	4 g										Z1					
Rimozione di pareti mobili in pannelli prefabbricati	6 g															
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamie	7 g															
Posa di serramenti esterni	5 g															
Montaggio di rete aerea agganciata a tiranti in acciaio ancorati alle	4 g															
Smobilizzo del cantiere	1 g															
LEGENDA Zona:																
Z1 = ZONA UNICA																

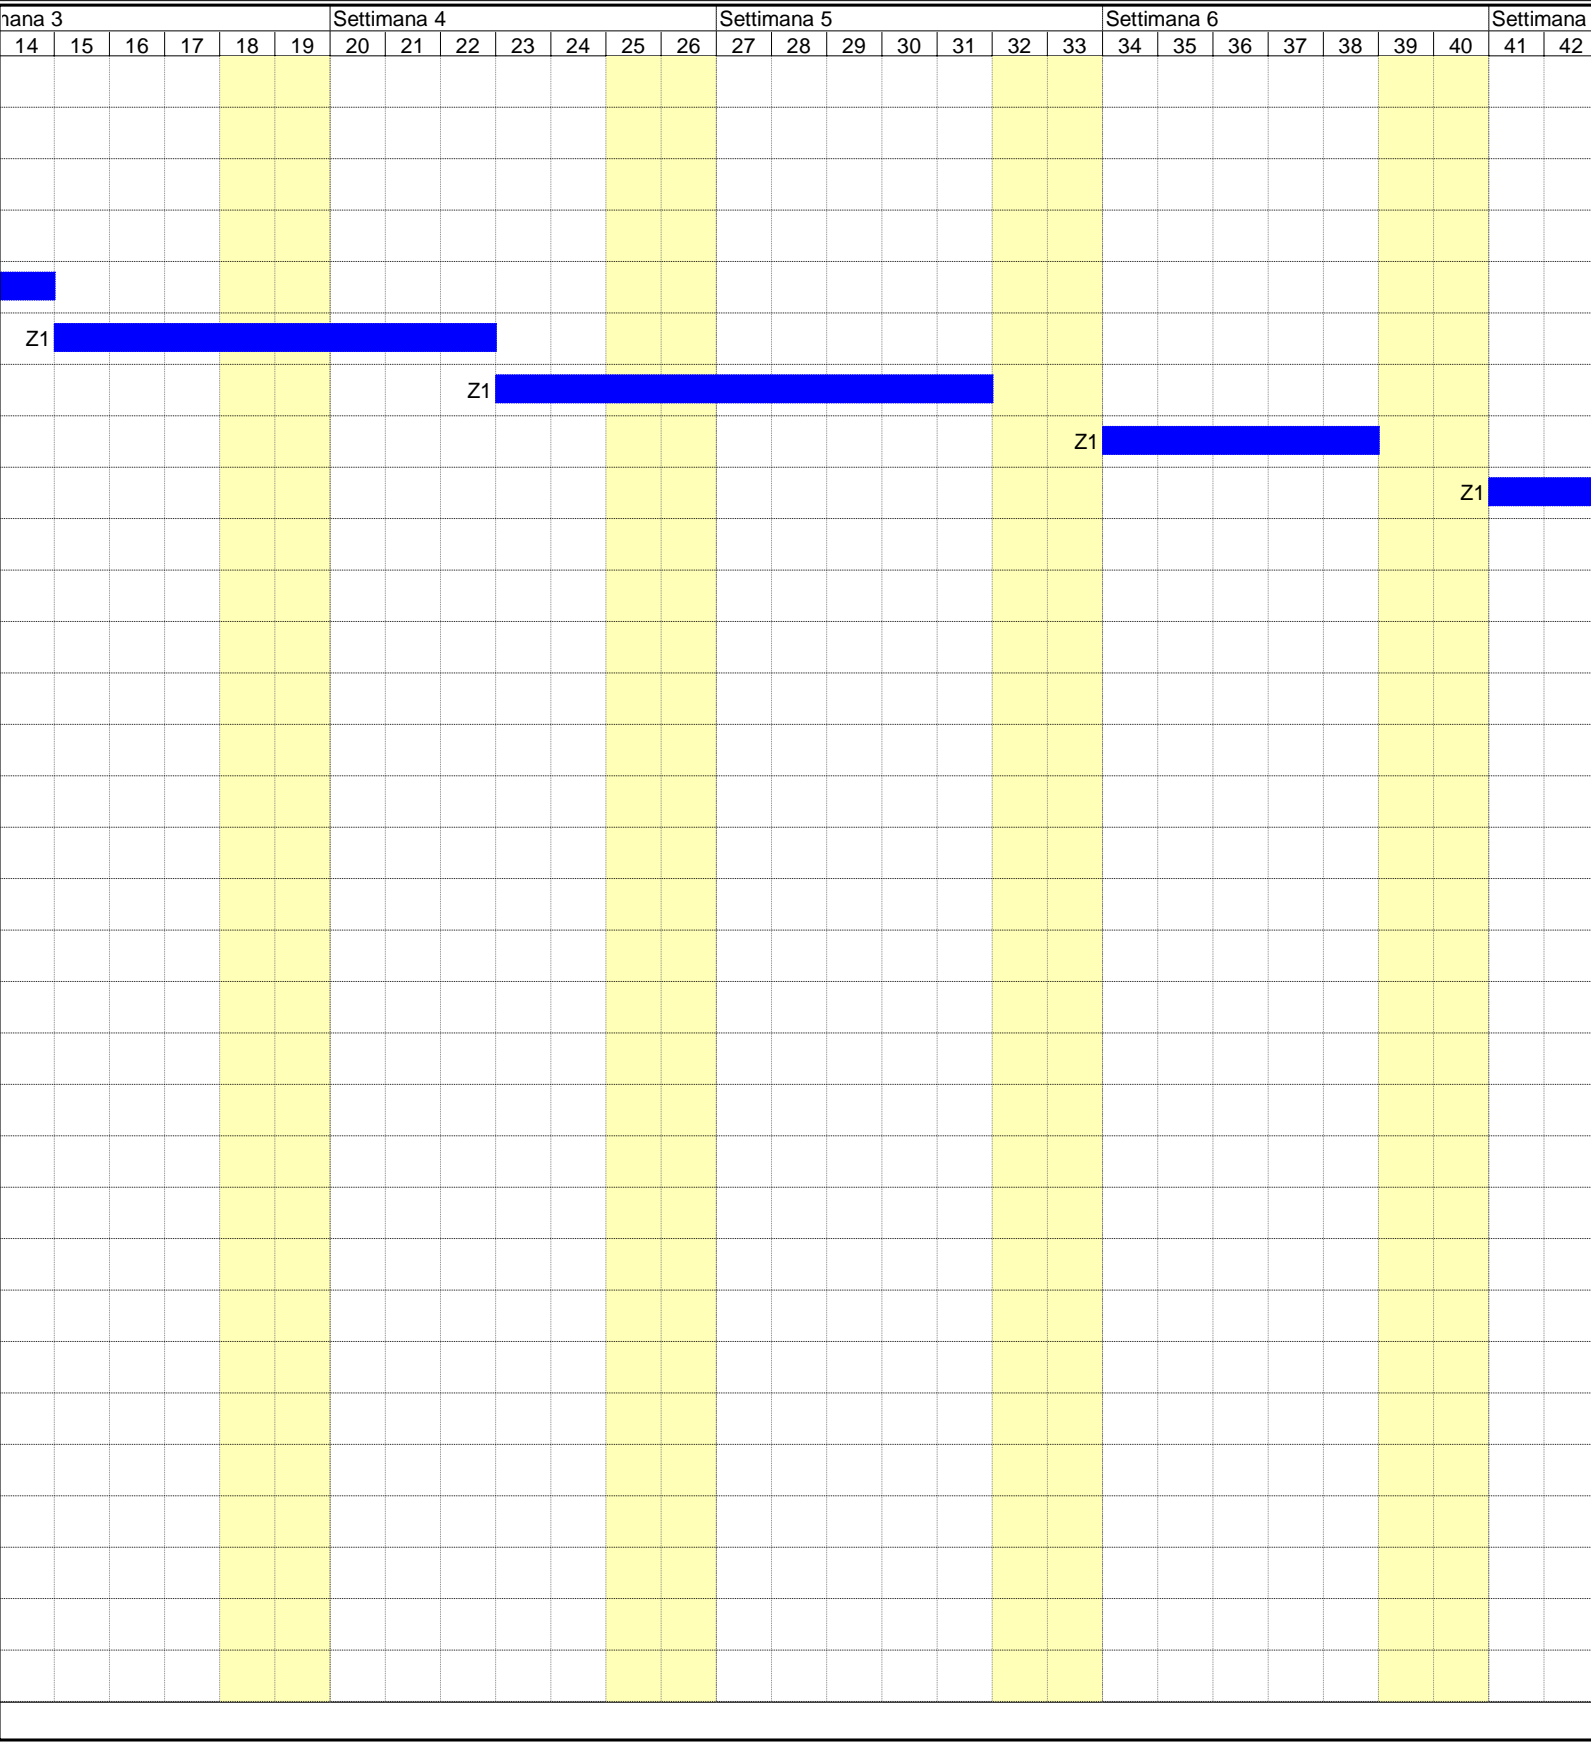

	Settimana 8												Settimana 9						Settimana 10					Settimana 11					
7	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
