

ALLEGATO "A"

Comune di Torino
Provincia di To

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA E PAVIMENTAZIONE TERRAZZI
COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO
CANTIERE: via Leoncavallo, 61, Torino (To)

Torino, l 20/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA
VIA BAZZI, 4
10152 TORINO (TO)
0114426071 - 0114426177

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	3		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	3		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2		
Rimozione di impermeabilizzazione su copertura piana	1	E	18	24		
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	10	12		
Rimozione di massetto	1	E	15	19		
Formazione di massetto per coperture	1	E	19	26		
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	20	26		
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	10	12		
Rimozione di pavimenti su balconi e logge	1	E	7	9		
Rimozione di massetto	1	E	7	10		
Impermeabilizzazione di balconi e logge	1	E	5	5		
Formazione di massetto per balconi e logge	1	E	5	5		
Posa di pavimenti su balconi e logge	1	E	6	8		
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settim				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g		Z1													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1													
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g							Z1								
Rimozione di impermeabilizzazione su copertura piana	18 g									Z1						
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	10 g															
Rimozione di massetto	15 g															
Formazione di massetto per coperture	19 g															
Impermeabilizzazione di coperture	20 g															
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g															
Rimozione di pavimenti su balconi e logge	7 g															
Rimozione di massetto	7 g															
Impermeabilizzazione di balconi e logge	5 g															
Formazione di massetto per balconi e logge	5 g															
Posa di pavimenti su balconi e logge	6 g															
Smobilizzo del cantiere	2 g															
LEGENDA Zona:																
Z1 = ZONA UNICA																

Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6					Settimana 7																							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42															
																				Z1																							

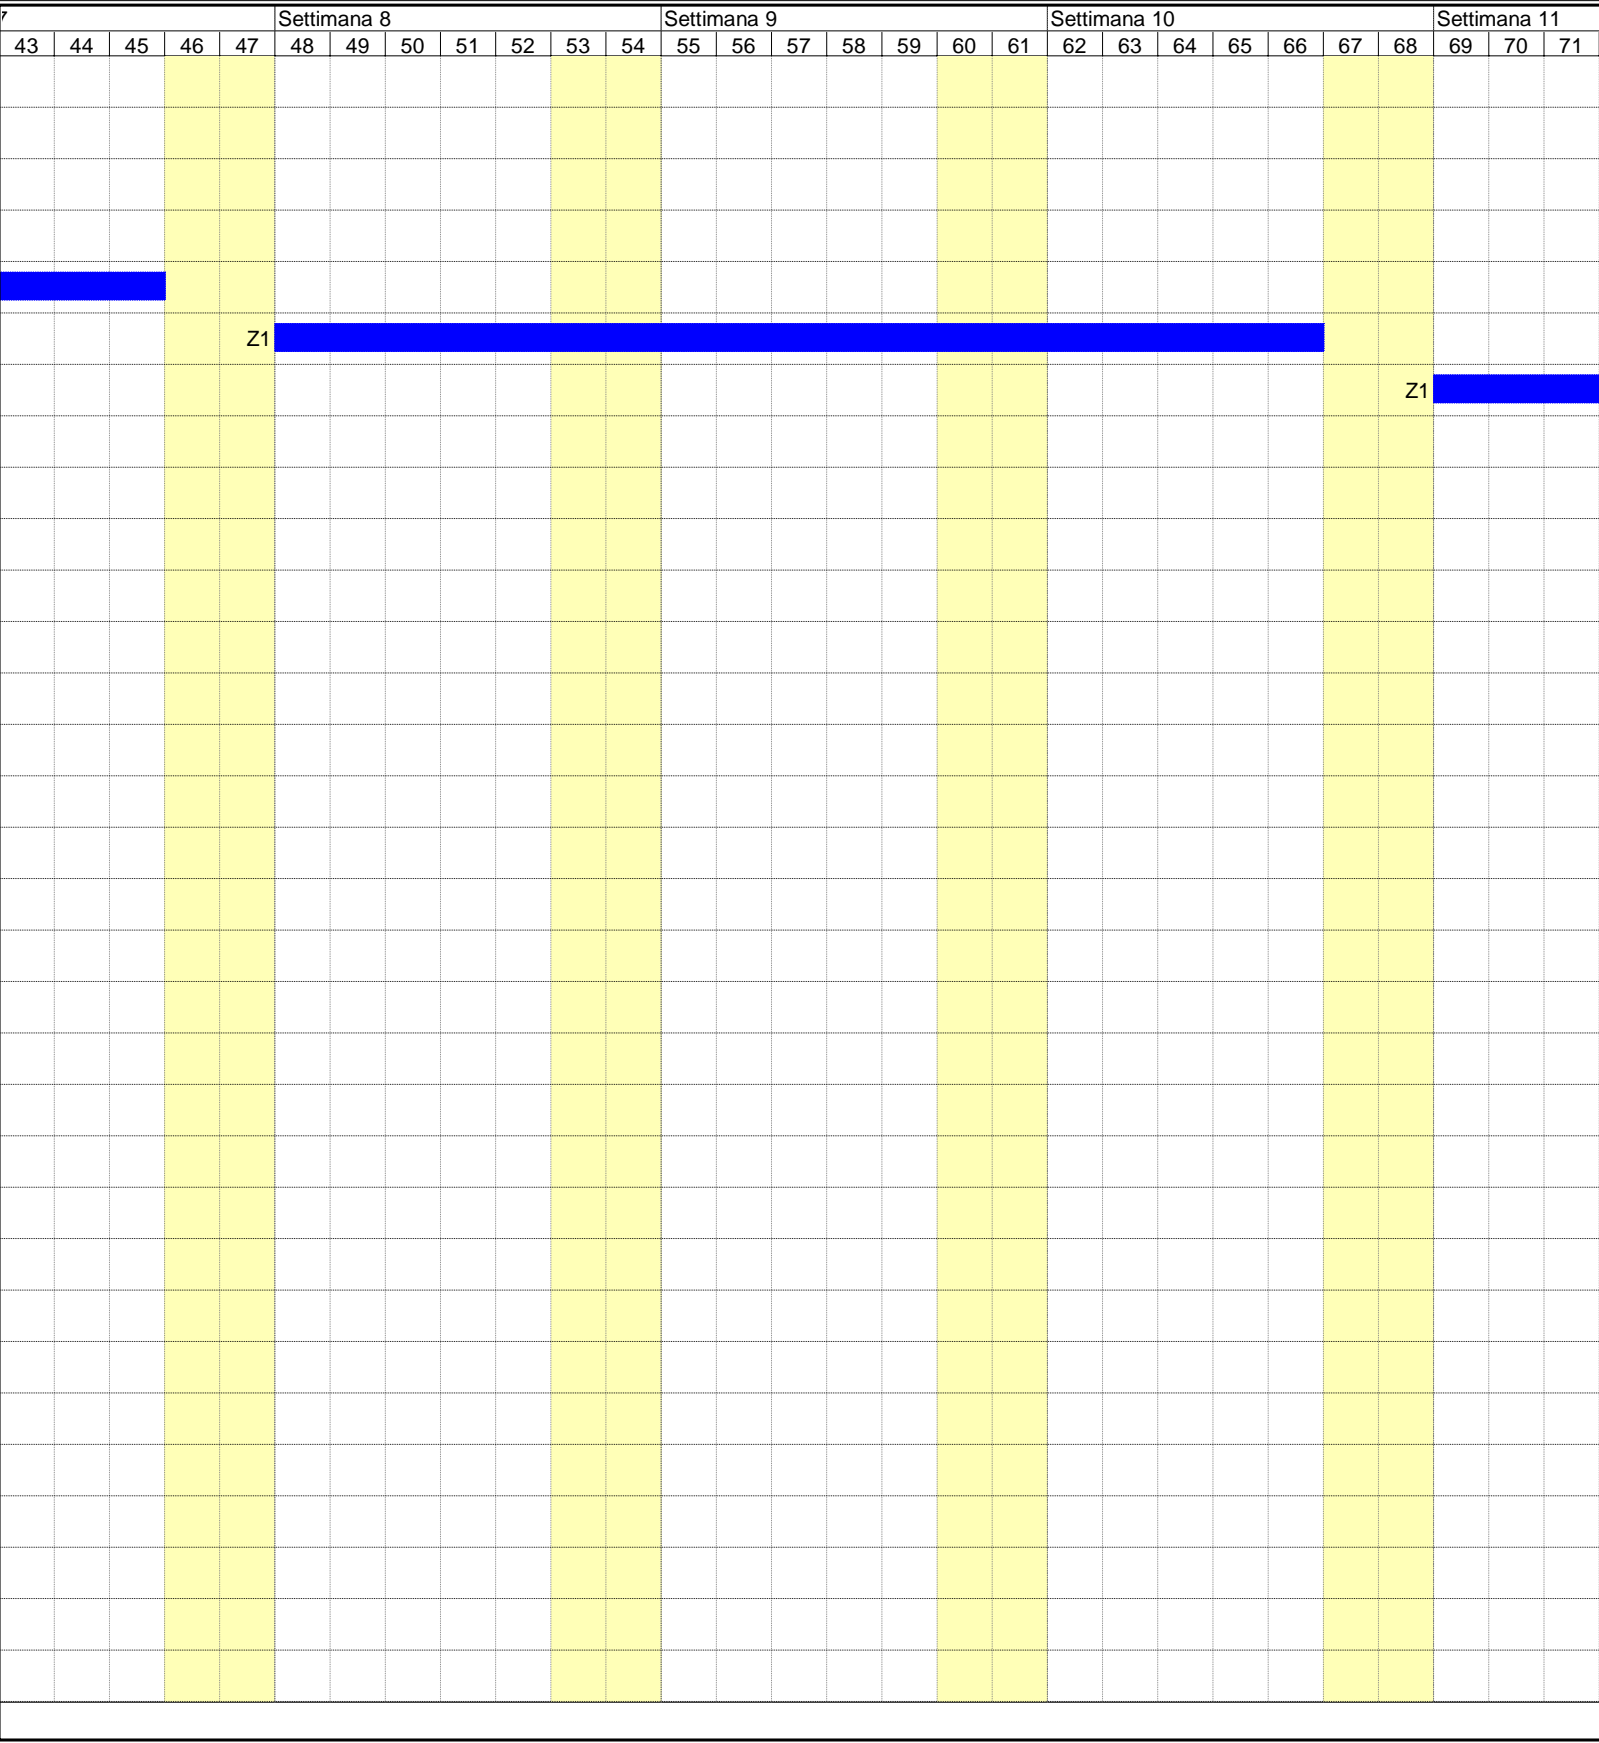

Settimana 20							Settimana 21							Settimana 22							Settimana 23							
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158

