

ALLEGATO "A"

Comune di Torino
Provincia di To

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Ristrutturazione servizi igienici piani rialzato, primo e secondo

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: via Tiraboschi, 33, Torino (To)

Torino, l 20/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA
VIA BAZZI, 4
10152 TORINO (TO)
0114426071 - 0114426177

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1		
Compartimentazione cantiere	1	E	2	4		
Rimozione di impianto elettrico	1	E	2	2		
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2		
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	7		
Rimozione di pavimenti interni	1	E	10	14		
Rimozione di massetto	1	E	10	14		
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	8	10		
Rimozione di impianti idrici	1	E	10	14		
Realizzazione di divisori interni	1	E	6	8		
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	10	14		
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	10	14		
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	10	14		
Posa di pavimenti per interni	1	E	10	14		
Posa di rivestimenti interni	1	E	10	15		
Posa di serramenti interni	1	E	4	6		
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	5	5		
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	4		
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1							Settimana 2						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1														
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g				Z1												
Compartimentazione cantiere	2 g						Z1										
Rimozione di impianto elettrico	2 g										Z1						
Rimozione di serramenti interni	2 g												Z1				
Demolizione di pareti divisorie	5 g												Z1				
Rimozione di pavimenti interni	10 g																
Rimozione di massetto	10 g																
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	8 g																
Rimozione di impianti idrici	10 g																
Realizzazione di divisori interni	6 g																
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	10 g																
Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g																
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g																
Posa di pavimenti per interni	10 g																
Posa di rivestimenti interni	10 g																
Posa di serramenti interni	4 g																
Realizzazione di impianto elettrico interno	5 g																
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																
Smobilizzo del cantiere	1 g																
LEGENDA Zona:																	
Z1 = ZONA UNICA																	

Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settin
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

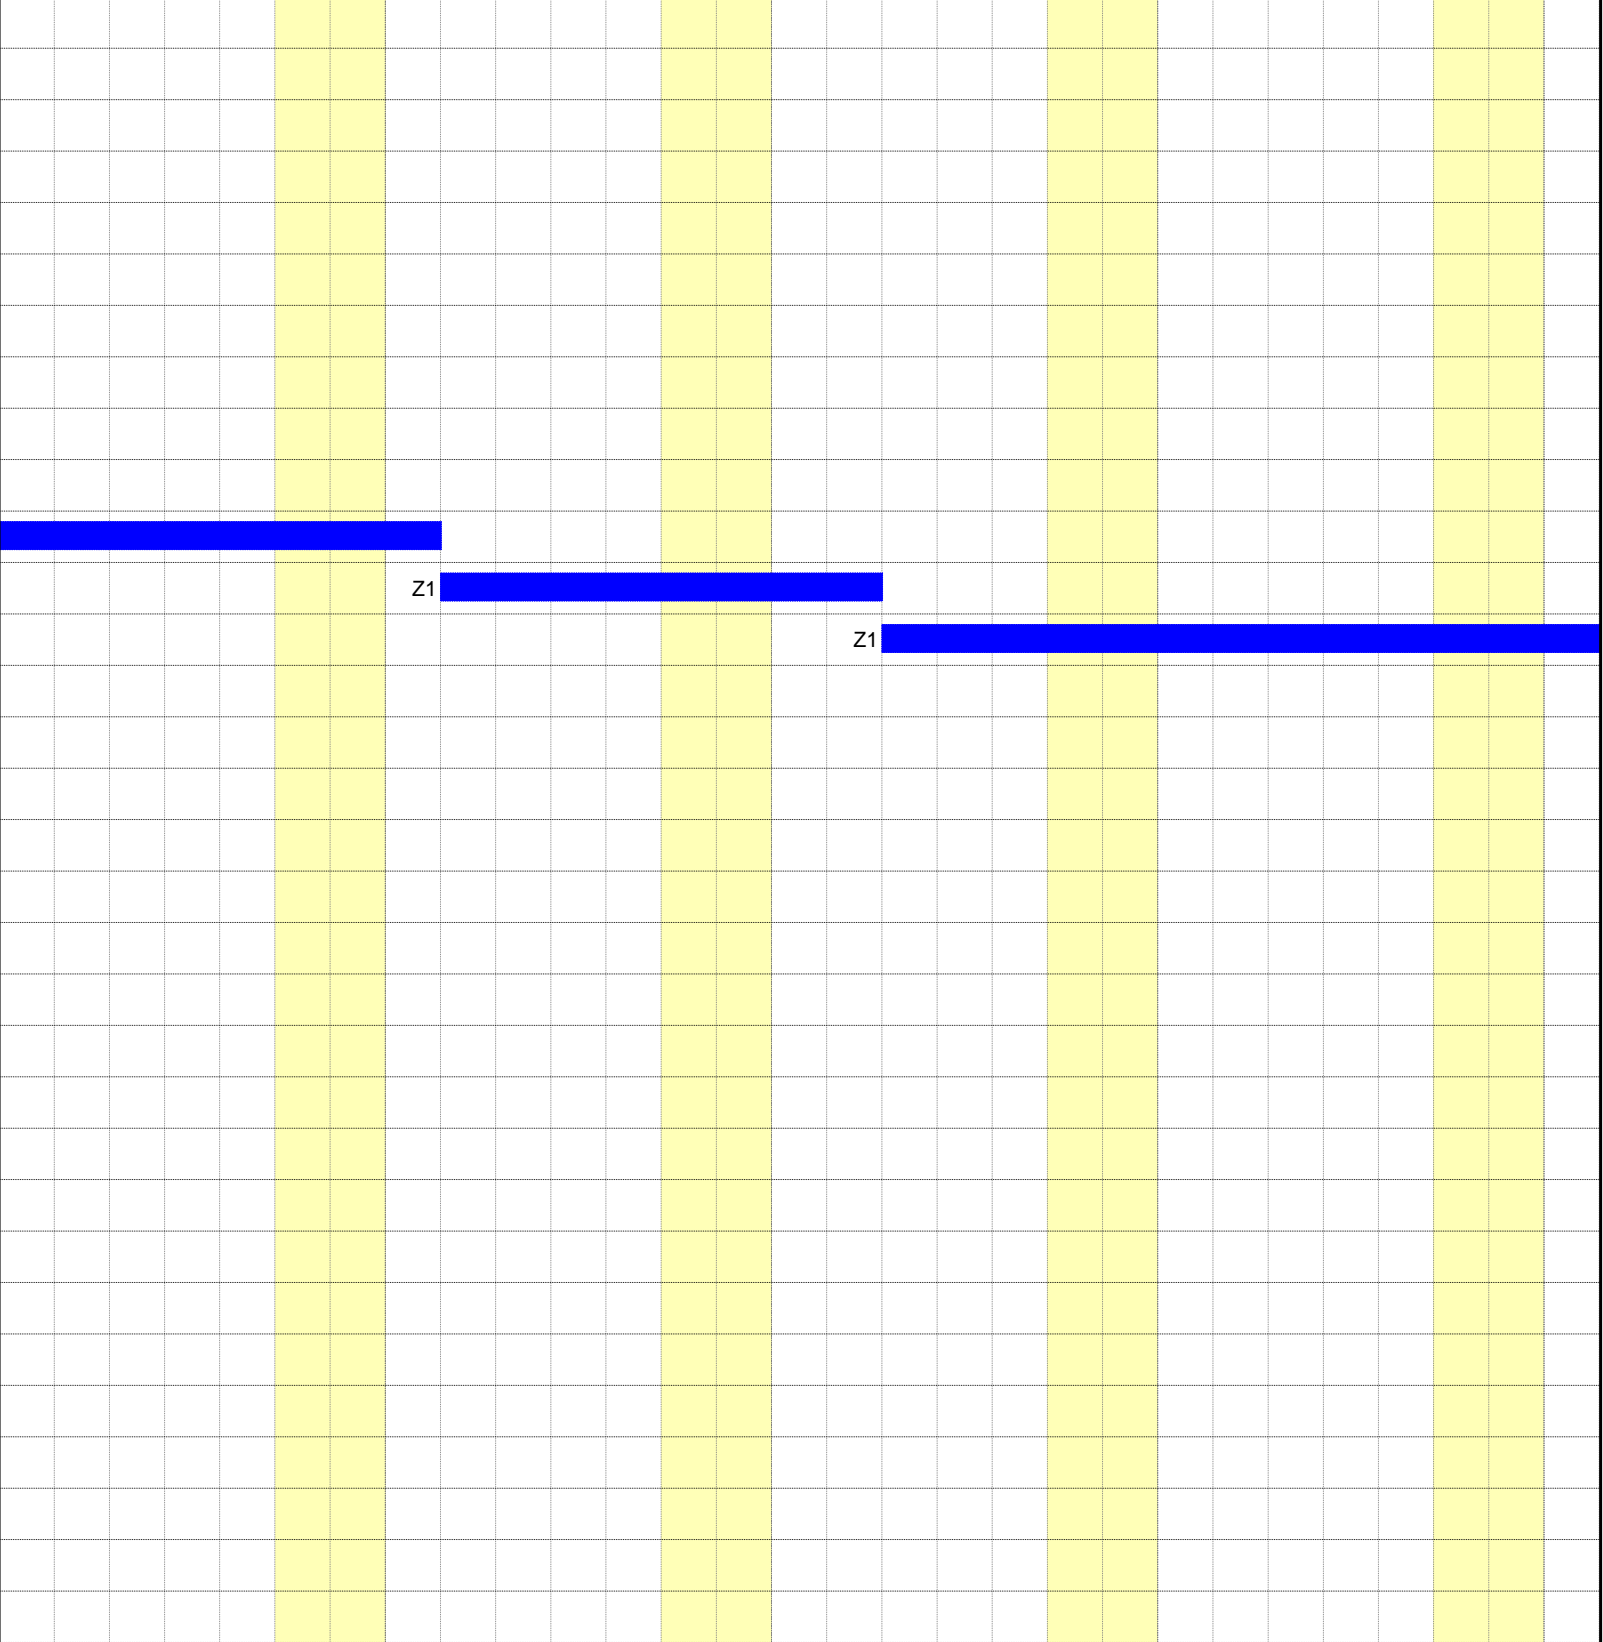

Settimana 11						Settimana 12							Settimana 13						Settimana 14					Settimana 15				
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Z1

Z1

Z1

5	Settimana 16					Settimana 17					Settimana 18					Settimana 19												
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129

