


Nome attività	Durata	26 Nov	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 Dic 12			17 Dic 12			
<b>Area cantiere</b>	4 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1	1														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1	1														
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g		Z1	1														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g				Z1	1												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenza	1 g					Z1	1											
<b>Ripristino dell'intonaco del muro del cortile fronte scuola</b>	36 g																	
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g							Z1			5							
Rimozione dell'intonaco del muro esterno fronte scuola	7 g												Z1				7	
Pre-rinzafo, rinzafo ed intonaco su rinzafo di murature umide	16 g																	
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g																	
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																	
<b>Realizzazione piastra dietro la palestra</b>	11 g																	
Demolizione pavimentazione in quadrotti di cemento esistenti	2 g							Z1			2							
Demolizione del sottofondo esistente	2 g								Z1		2							
Lisciatura del piano di posa	2 g											Z1						
Fornitura e posa del telo impermeabile per separazione strati	1 g																Z1	
Formazione di massetto per esterni compresa la posa della rete	2 g																Z1	
Posa di pavimenti per esterni in quadrotti di cemento	2 g																	Z1
<b>Sostituzione delle staccionate in legno ammalorate</b>	10 g																	
Rimozione della vecchia staccionata in legno	3 g																	
Costruzione di palizzata in legno	7 g																	
<b>Riparazione del muretto in mattoni soggetto agli smottamenti</b>	11 g																	
Demolizione del muretto in muratura danneggiato	1 g																	
Scavo eseguito a mano per realizzazione del nuovo muretto in cls	2 g																	
Formazione di magrone di sottofondazione compresa la provvista	2 g																	
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2 g																	
Realizzazione della carpenteria del nuovo muretto in cls	2 g																	
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2 g																	
<b>Riparazione gelosie e porte in legno del piano terra</b>	4 g																	
Riparazione delle gelosie e serramenti in legno	4 g																	
<b>Ristuccatura dei vetri della palestra</b>	8 g																	
Rimozione e successiva posa di mastice ferma vetri	8 g																	
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g																	



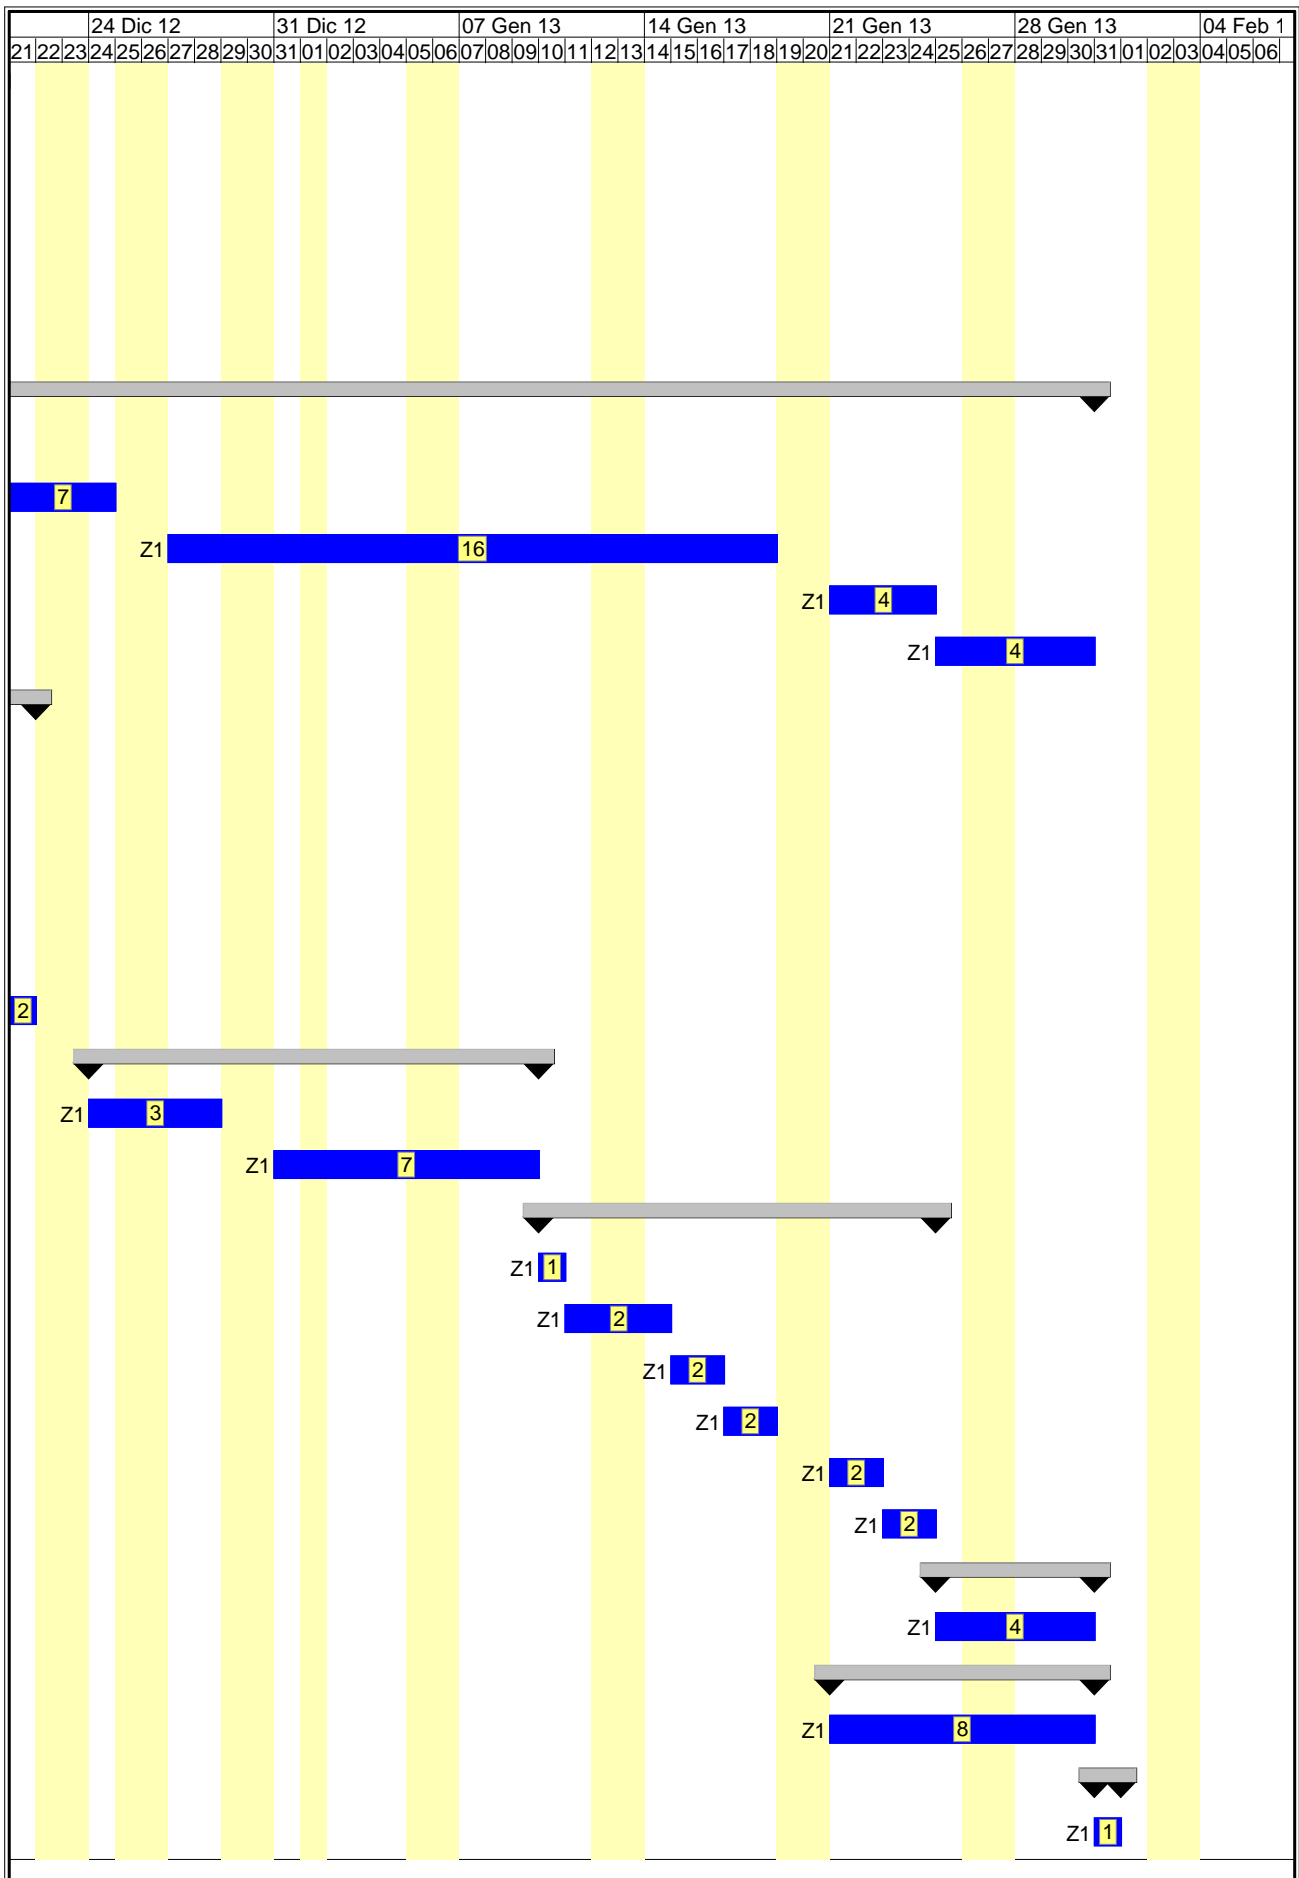

24 Dic 12			31 Dic 12			07 Gen 13			14 Gen 13			21 Gen 13			28 Gen 13			04 Feb 13																																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06						
