


PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE TRATTO PIAZZA GRAN MADRE - VIA ROMANI - VIA BRICCA - scala 1 : 200

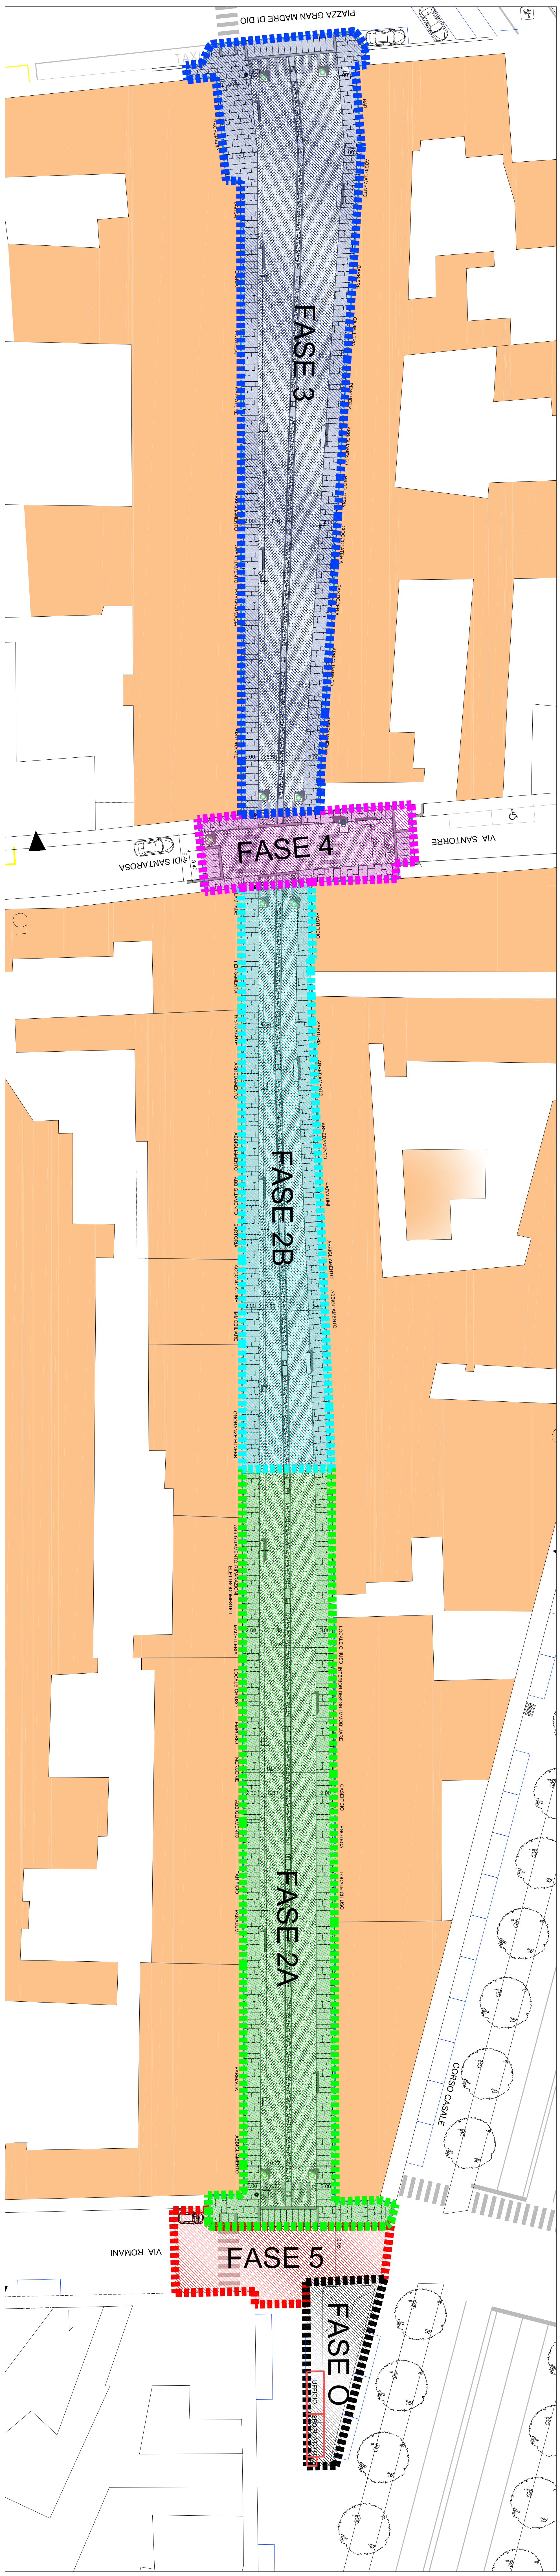

LEGENDA FASI DI CANTIERE

- FASE 0 Isolazione area fissa di cantiere
Durata 5 giorni
- FASE 1 Corsi Casale
Ripristo sotto vocazione
Durata 3 giorni
- FASE 2A Dal via Romani - verso via Santorre di Santarosa
Ricostruzione pavimentazione stradale in materiale lapideo
Durata 10 giorni
- FASE 2B Fraz. via Santorre di Santarosa
Ricostruzione pavimentazione stradale in materiale lapideo
Durata 10 giorni
- FASE 3 Via Santorre di Santarosa - Fraz. Gian Maria
Ricostruzione pavimentazione stradale in materiale lapideo
Durata 10 giorni
- FASE 4 Ripristino via Santorre di Santarosa
Ricostruzione pavimentazione stradale in materiale lapideo
Durata 10 giorni
- FASE 5 Imposta ai Romani
Sostituzione e richiamo tipo di durata
Durata 5 giorni

PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE TRATTO VIA ROMANI - VIA BRICCA - scala 1 : 200

