Nome attività	
CANTIERE	1 g
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	9 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
FASE 1 (e sottofasi) BLOCCO A	1 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	12 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	7 g
Demolizione di pareti divisorie	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	4 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	1 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	5 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
OPERE EDILI IN GENERE	23 g
Realizzazione di canna fumaria	10 g
Realizzazione di comignolo	2 g
Realizzazione di divisori interni	6 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g
OPERE INTERNE	13 g
Posa di serramenti interni	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	3 g
FASE 2 (e sottofasi) BLOCCO B	20 g
OPERE INTERNE	20 g
Posa di serramenti interni	14 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici vert	3 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	27 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	8 g
Demolizione di pareti divisorie	3 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	1 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	19 g
Rimozione di impianti	1 g
Rimozione di massetto	11 g
Rimozione di pavimenti interni	6 g
Rimozione di serramenti interni	1 g
FASE 3 (e sottofasi) BLOCCO C	89 g
OPERE INTERNE	57 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	15 g
Posa di pavimenti per interni	18 g
Realizzazione di divisori interni	6 g
Tinteggiatura di superfici interne	9 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g
Posa di serramenti interni	5 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	32 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	11 g
Demolizione di pareti divisorie	4 g
Taglio di muratura a tutto spessore	3 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	32 g
Rimozione di impianti	1 g
Rimozione di massetto	12 g
Rimozione di pavimenti interni	6 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
SMOBILIZZO CANTIERE	12 g
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	12 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Pulizia generale	7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = INIZIO CANTIERE

Z2 = FASE 1 e sottofasi- BLOCCO A

Z3 = FASE 2 e sottofasi-BLOCCO B

Z4 = FASE 3 e sottofasi-BLOCCO C
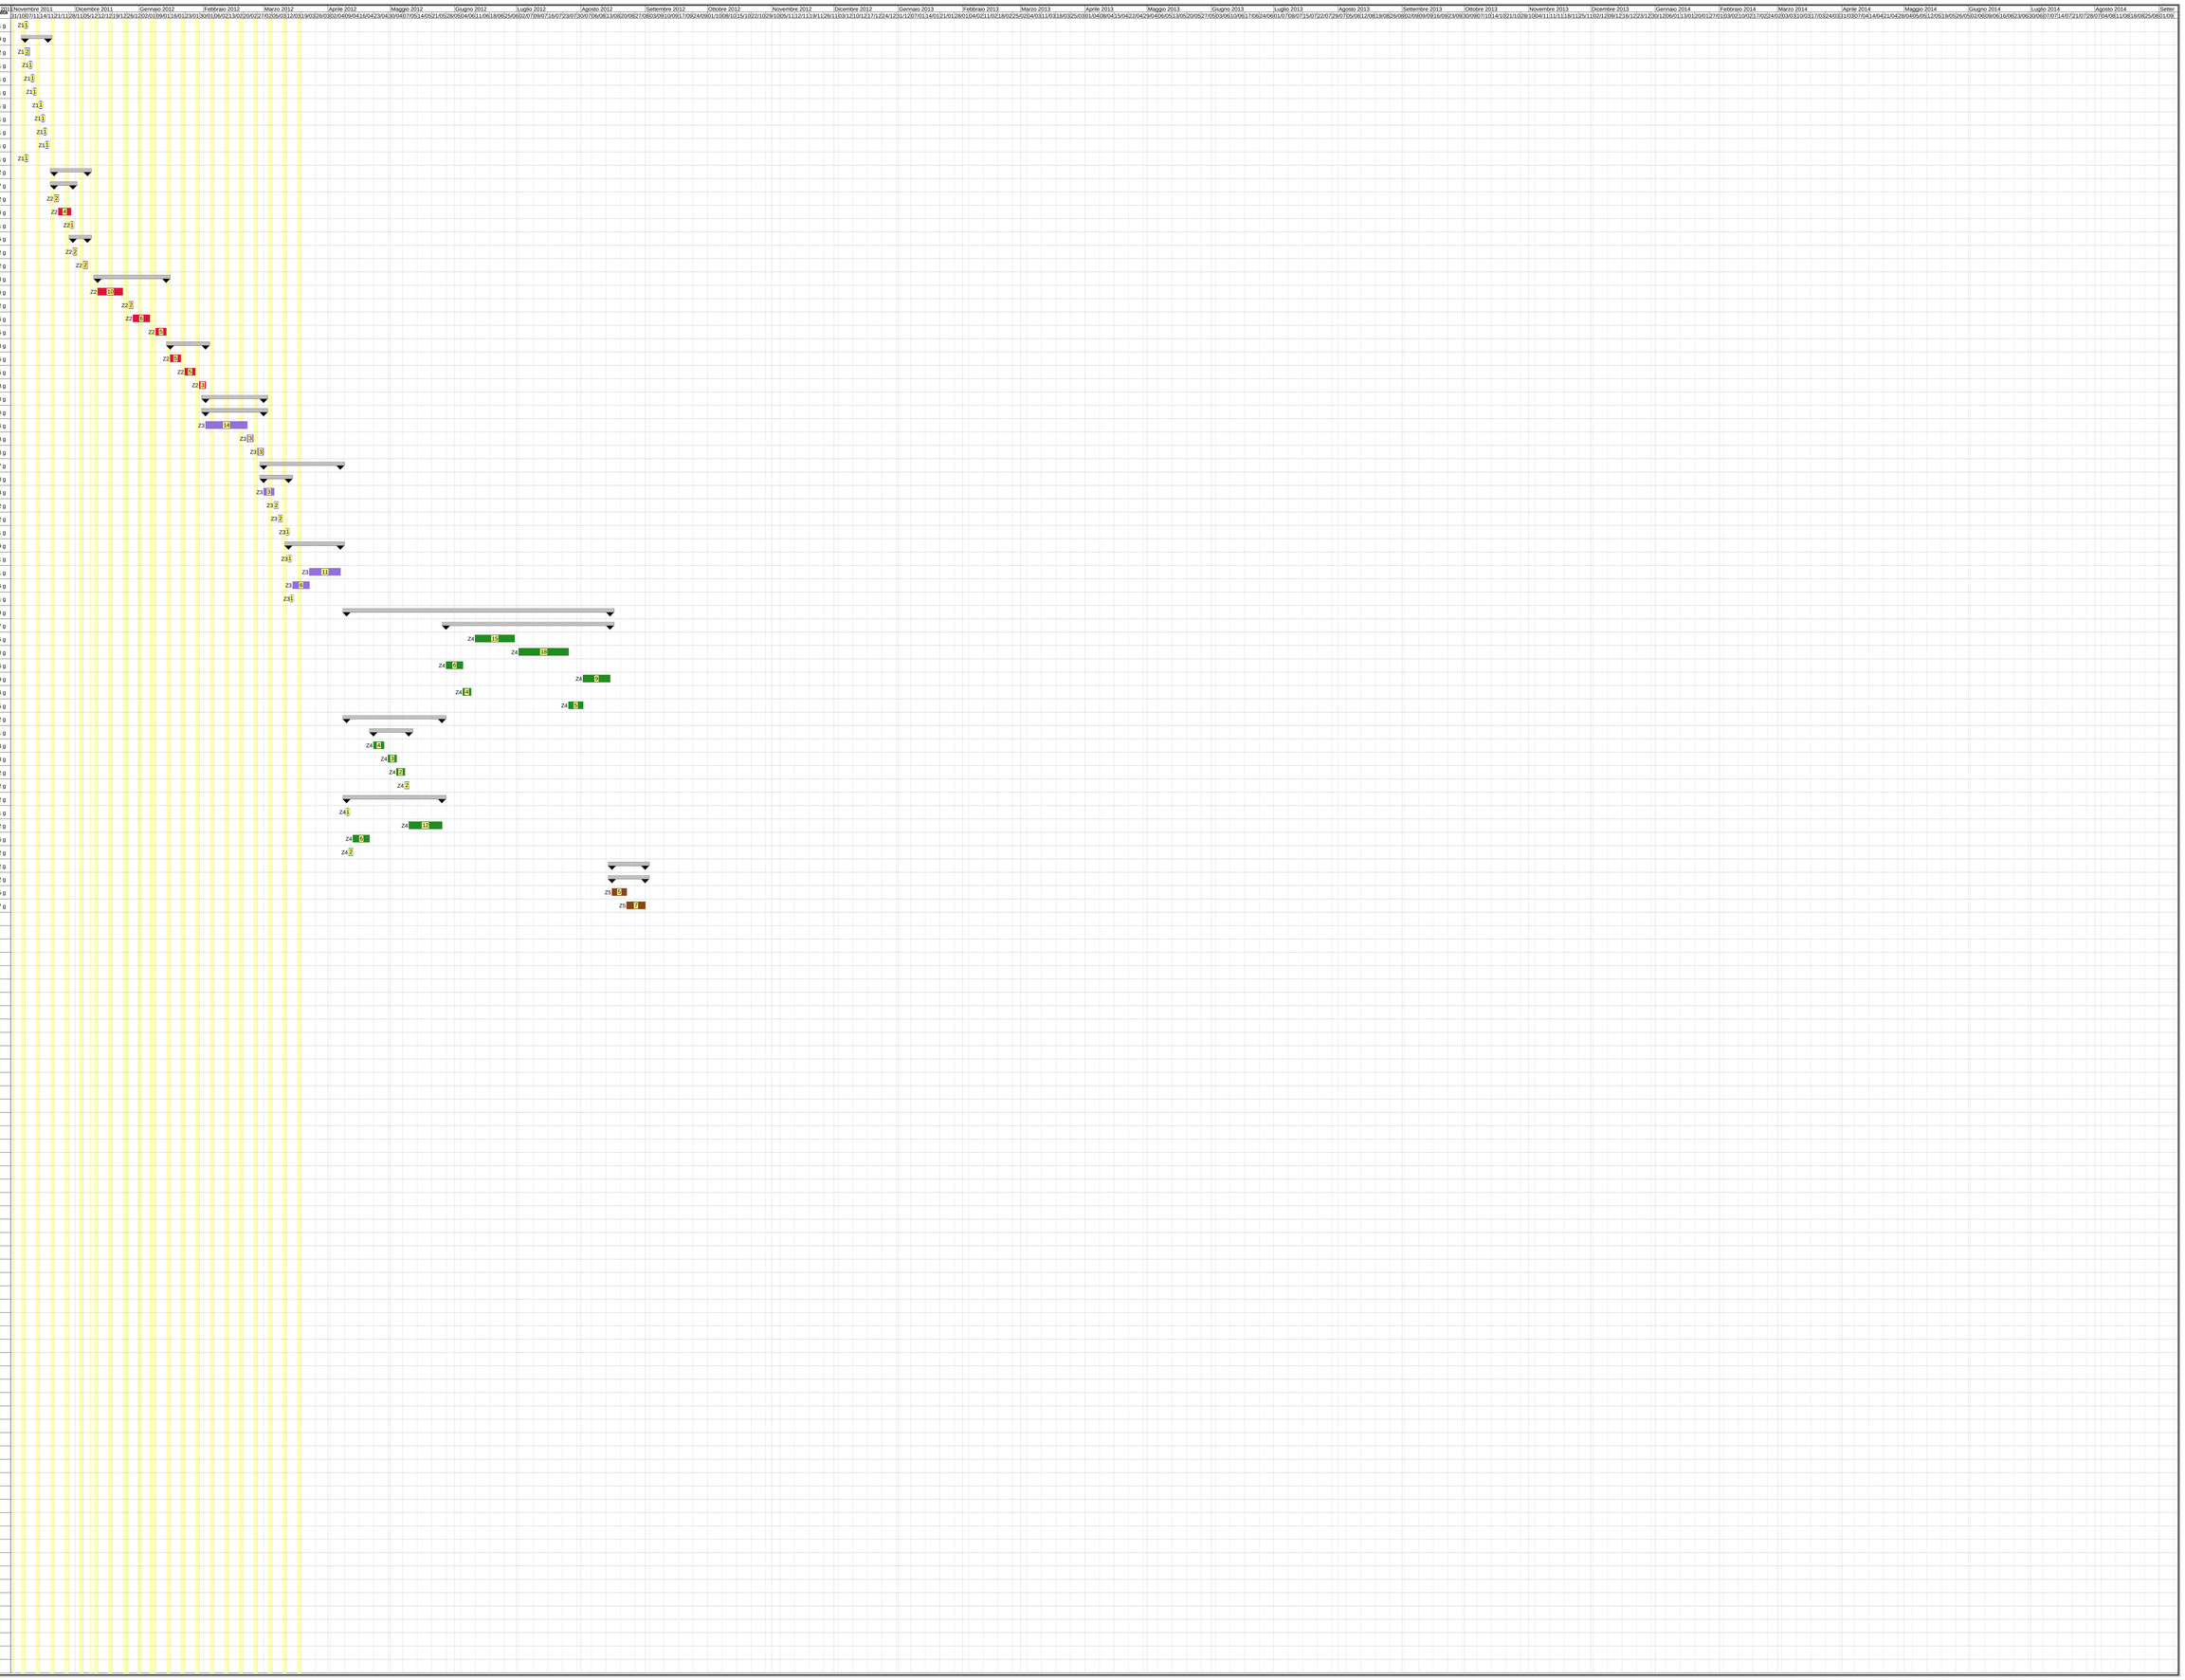
Z5 = SMOBILIZZO CANTIERE
