Manutenzione Straordinaria Ponti Anno 2010

ID	Task Name	Durata
1	**ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE PASSERELLA MANATONA**	3 giorni
2	SMOUNTAGGIOAL REVISIONE / INTERPAZIONE CARPENTERIE METALLICHE IMPALCATO	14 giorni
3	RIMOZIONE GRIGLIATI METALLICI LUNGO IMPALCATO	3 giorni
4	RIMOZIONE SOLETTA IN CLS E TAVOLATO IN LEGNO ESISTENTE SU IMPALCATO	14 giorni
5	POSA IN OPERA NUOVO TAVOLATO IN LEGNO SU IMPALCATO	14 giorni
6	SMALLAMENTO RINGHIERA PARAPETTO SU IMPALCATO E RAMPE	7 giorni
7	STESA INTARGGIONE E VERNICIATURA CARPENTERIE METALLICHE	7 giorni
8	RIMOZIONE PARTE DEGRADATA PARAPETTO SUPERIORE SU RAMPA SIGNIT RAMPA OVEST	3 giorni
9	RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE C.A. + STESA TRATTAMENTO PROTETTIVO	10 giorni
10	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	2 giorni
11	**ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE PASSERELLA VIA BORSI**	3 giorni
12	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE	5 giorni
13	MANUTENZIONE RETE RACCOLTA ACQUE E REALIZZAZIONE FORI DRENAGGIO	4 giorni
14	IDROSABBIATURA SUPERFICI CLS E MURATURA	2 giorni
15	RISANAMENTO CONSERVATIVO FASCE IN MATTONI	7 giorni
16	RICOSTRUZIONE PILA CENTRALE	7 giorni
17	STESA MPERMEABILIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU IMPALCATO	7 giorni
18	STESA TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERIORE CLS	5 giorni
19	SOSTITUZIONE LASTRE MARCIAPIEDI LATERALI	3 giorni
20	RISAGOMATURA TERRENI SPONDA DESTRA DORA	3 giorni
21	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	2 giorni
22	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE P.TE C.SO REGINA MARGHERITA SULLA DORA	2 giorni
23	CREAZIONE VARCHI NEGLI SPARTITRAFFICO	2 giorni
24	TAGLIO PAVIMENTAZIONE, IMPERMABILIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE GIUNTI	10 giorni
25	SOSTITUZIONE LASTRE MARCIAPIEDI LATERALI	10 giorni
26	SIGILLATURA LESIONI PARAPETTI IN C.A. E STESA TRATTAMENTO PROTETTIVO	2 giorni
27	DISVELAMENTO, STESA INTRUSGGINE E VERNICIATURA PARAPETTI METALLICI	3 giorni
28	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE CAP.TE MARFICI	2 giorni
29	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	2 giorni
30	**ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE CAVALCAVIA VIA PIANEZZA**	3 giorni
31	TAGLIO PAVIMENTAZIONE, IMPERMABILIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE GIUNTI	20 giorni
32	RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE IN C.A.	10 giorni
33	STESA TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERIORE CLS	3 giorni
34	SOSTITUZIONE LASTRE MARCIAPIEDI LATERALI	10 giorni
35	MANUTENZIONE RETE RACCOLTA ACQUE	4 giorni
36	DISVELAMGGIO, STESA INTRUSGGINE E VERNICIATURA PARAPETTI METALLICI	3 giorni
37	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	2 giorni

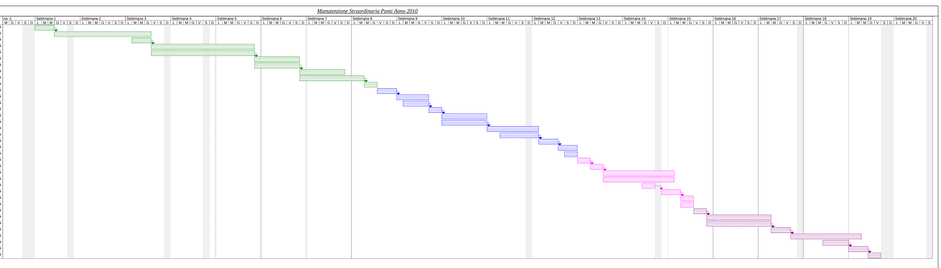

Il Coordinatore della Sicurezza in progettazione: Ing. Rodano SALZA
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giorgio MARINO
