| Nome attività | Durata |
|---|---|
| AREA DI CANTIERE | |
| **ALLESTIMENTO DEL CANTIERE** | 12 g |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 2 g |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 2 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 2 g |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 2 g |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 g |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 g |
| Realizzazione di impianto idrico del cantiere | 1 g |
| **BONIFICA ORDIGNI BELLICI, SCAVI, REINTERRI** | 8 g |
| | 8 g |
| Esplorazione del terreno | 2 g |
| Scavo per recupero e rimozione degli ordigni bellici | 4 g |
| Bonifica del terreno | 2 g |
| | 18 g |
| **DISFACIMENTI E RIMOZIONI (MIRANTI) (CUNICOLI SOTTERRANEI)** | 18 g |
| Allestimento unità di decontaminazione bonifica amianto | 2 g |
| Rimozione amianto e rivestimento manufatti lentificati | 16 g |
| **DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI** | 2 g |
| **DEMOLIZIONI E TAGLI STRUTTURE ESISTENTI IN SITO** | 2 g |
| Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici | 2 g |
| **BONIFICA AMBIENTALE** | 27 g |
| Scavo di sbancamento | 7 g |
| Bonifica e smaltimento delle terre scavate | 20 g |
| **SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI E OPERE DI SOSTEGNO** | 7 g |
| **SCAVI PER OPERE EDILI** | 7 g |
| Scavi a sezione obbligata | 5 g |
| Montaggio delle gru a torre | 2 g |
| **OPERE STRUTTURALI** | 101 g |
| **CEMENTO ARMATO - BLOCCHI A-B-C - FONDAZIONI E MURI ENTROTERRA** | 40 g |
| Contenimento dei fuori sagoma - posa in opera PALINCOLE | 13 g |
| Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione | 7 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione | 6 g |
| Getti in calcestruzzo per le strutture in fondazione | 1 g |
| Realizzazione della carpenteria murr perimetrali interrati | 8 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura murr perimetrali interrati | 3 g |
| Getti di calcestruzzo murr perimetrali interrati | 2 g |
| Impermeabilizzazione di pareti controterra | 5 g |
| Rinterro di scavi | 2 g |
| **CEMENTO ARMATO - BLOCCHI A-B-C - SOLAI F.T. - STRUTTURE IN ELEVAZIONE F.T.** | 26 g |
| Realizzazione collettori di scarico rete idrico sanitaria Blocchi B-C | 2 g |
| Realizzazione di solaio in c.a. piano terreno + scale | 6 g |
| Realizzazione della carpenteria per pilastri piano terreno | 2 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per pilastri piano terreno | 1 g |
| Getti in calcestruzzo per pilastri piano terreno | 1 g |
| Montaggio del portaggio metallico fisso | 3 g |
| Realizzazione di solaio in c.a. piano primo + scale | 5 g |
| Realizzazione della carpenteria pilastri piano primo | 2 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura pilastri piano primo | 1 g |
| Getti in calcestruzzo pilastri piano primo | 2 g |
| **TETTO IN LEGNO + COPERTURE + FALDALERIA - BLOCCHI A-B-C** | 36 g |
| Capriate, orditure in legno | 9 g |
| Applicazione di lastre in calcio silicato REI 90 | 3 g |
| Montaggio di lavolaio in abete | 3 g |
| Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici inclinate | 3 g |
| Realizzazione di opere di lattoneria | 4 g |
| Posa dei manti di copertura | 5 g |
| Impermeabilizzazione solette terrazzi | 1 g |
| Posa di pavimenti su copertura piana | 2 g |
| **OPERE IN FACCIATA - BLOCCHI A-B-C** | 24 g |
| Realizzazione di rampimurate | 10 g |
| Formazione intonaci esterni (tradizionali) | 10 g |
| Posa di serramenti esterni | 4 g |
| **TINTEGGIATURE ESTERNE** | 7 g |
| Tinteggiatura di superfici esterne | 7 g |
| **OPERE INTERNE - EDILE E IMPIANTI - BLOCCO C** | 66 g |
| Realizzazione di divisori interni | 11 g |
| Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas | 5 g |
| Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio | 4 g |
| Realizzazione di impianti elettrici, telefonici e TV | 8 g |
| Formazione intonaci interni | 10 g |
| Realizzazione rete di distribuzione e serpentine a pavimento impianto termico | 7 g |
| Formazione di massetto per pavimenti interni | 4 g |
| Posa di pavimenti per interni | 6 g |
| Posa di rivestimenti interni | 5 g |
| Posa di serramenti interni | 3 g |
| Tinteggiatura di superfici interne | 5 g |
| **OPERE INTERNE - EDILE E IMPIANTI - BLOCCO B** | 66 g |
| Realizzazione di divisori interni | 11 g |
| Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas | 5 g |
| Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio | 4 g |
| Realizzazione di impianti elettrici, telefonici e TV | 8 g |
| Formazione intonaci interni | 10 g |
| Realizzazione rete di distribuzione e serpentine a pavimento impianto termico | 7 g |
| Formazione di massetto per pavimenti interni | 4 g |
| Posa di pavimenti per interni | 6 g |
| Posa di rivestimenti interni | 5 g |
| Posa di serramenti interni | 3 g |
| Tinteggiatura di superfici interne | 5 g |
| **OPERE INTERNE - EDILE E IMPIANTI - BLOCCO A** | 110 g |
| Realizzazione di divisori interni | 18 g |
| Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas | 9 g |
| Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio | 6 g |
| Realizzazione di impianti elettrici, telefonici e TV | 14 g |
| Formazione intonaci interni | 17 g |
| Rete distribuzione e serpentine impianto termico | 7 g |
| Formazione di massetto per pavimenti interni | 7 g |
| Posa di pavimenti per interni | 10 g |
| Posa di rivestimenti interni | 9 g |
| Posa di serramenti interni | 3 g |
| Tinteggiatura di superfici interne | 10 g |
| **IMPIANTI TECNOLOGICI** | 41 g |
| Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) | 7 g |
| Realizzazione di impianto ascensore | 10 g |
| Realizzazione di impianto fotovoltaico | 10 g |
| Realizzazione di impianto pannelli solari | 10 g |
| Smontaggio della gru a torre | 2 g |
| Smontaggio del portaggio metallico fisso | 2 g |
| **FINITURE E SISTEMAZIONI ESTERNE** | 20 g |
| Formazione di massetto per esterno | 7 g |
| Posa di pavimenti per esterni | 7 g |
| Posa di recinzioni e cancellate | 4 g |
| Messa a dimora di piante | 1 g |
| Formazione di tappeto erboso | 1 g |
| **SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA GENERALE** | 8 g |
| Smobilizzo del cantiere, pulizia area di cantiere | 8 g |

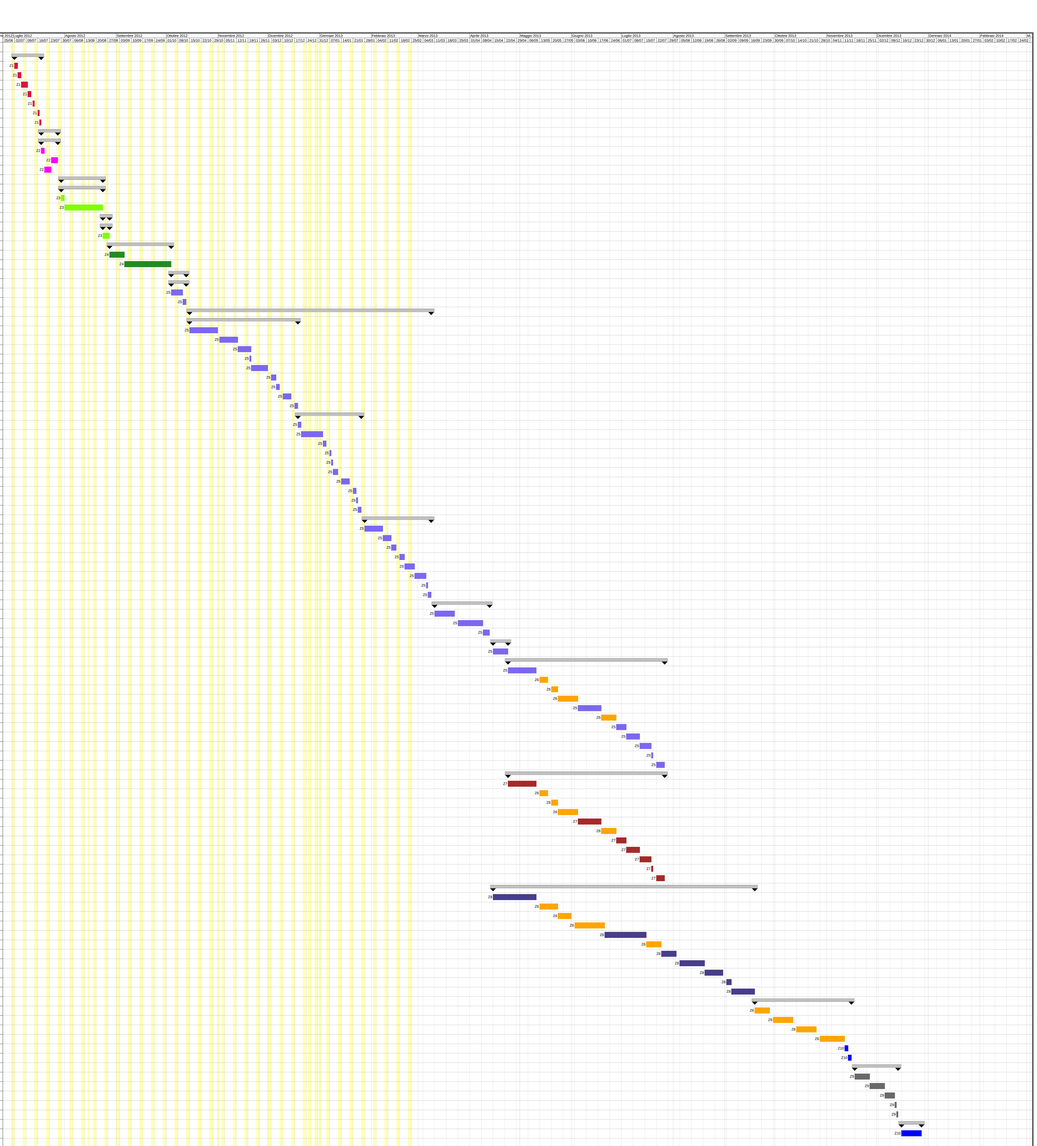


**LEGENDA Zone**

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE
Z2 = FASE 1 e sottofasi
Z3 = FASE 2 e sottofasi
Z4 = FASE 3 e sottofasi
Z5 = FASE 4 - BLOCHI A-B-C
Z6 = FASE 4 IMPIANTI
Z7 = FASE 4 - BLOCCO B
Z8 = FASE 4 - BLOCCO A
Z9 = SISTEMAZIONI ESTERNE
Z10 = SMOBILIZZO CANTIERE
