Nome attività	Durata
CORSO LOMBARDIA	
RIMOZIONE AMIANTO	10 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	3 g
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o gro	7 g
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	119 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g
Allestimento e smobilizzo di unità decontaminazione amianto	5 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	30 g
Montaggio e smontaggio della gru a torre	13 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	5 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	3 g
Smobilizzo del cantiere	10 g
DEMOLIZIONI e RIMOZIONI	37 g
Rimozione di serramenti esterni	4 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	5 g
Rimozione di manto di copertura in tegole	15 g
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	9 g
NUOVA COPERTURA,RIFACIMENTI e RIPRISTINI	49 g
Montaggio di travi in legno	8 g
Montaggio di copertura in lamiera grecata	22 g
Posa di linea salvavita	5 g
Posa di lucernario (e di serramenti su tetto)	5 g
Realizzazione di tamponature esterne tradizionali (pacchetto	7 g
Posa di serramenti interni	2 g
Impermeabilizzazione di coperture - cornicione edificio	8 g
Realizzazione di opere di lattoneria	14 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g
OPERE SUI FRONTI EST, OVES E SUD	63 g
Lavorazione elementi in ferro su ringhiere	10 g
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	15 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	15 g
Posa di rivestimenti esterni (in pietra - davanzali e portali)	10 g
Tinteggiatura di superfici esterne	22 g
CORTILE - INTERVENTI GRUPPI BOX	24 g
Rimozione di impermeabilizzazione e massetto su copertura l	5 g
Formazione di massetto per balconi, logge e cornicioni - cope	10 g
Impermeabilizzazione di coperture - coperture box cortile	9 g
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g
Opere IMPIANTISTICHE - RIPRISTINI, RIFACIMENTI di PARTI e	17 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar	5 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	3 g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm	2 g
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	4 g
CORSO FERRARA	
Allestimento cantiere Corso Ferrara	44 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	4 g
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	25 g
Rimozione di serramenti esterni	22 g
Rimozione di serramenti interni	5 g
NUOVE OPERE	29 g
Posa di serramenti esterni	26 g
Posa di serramenti interni	5 g

LEGENDA Zona:
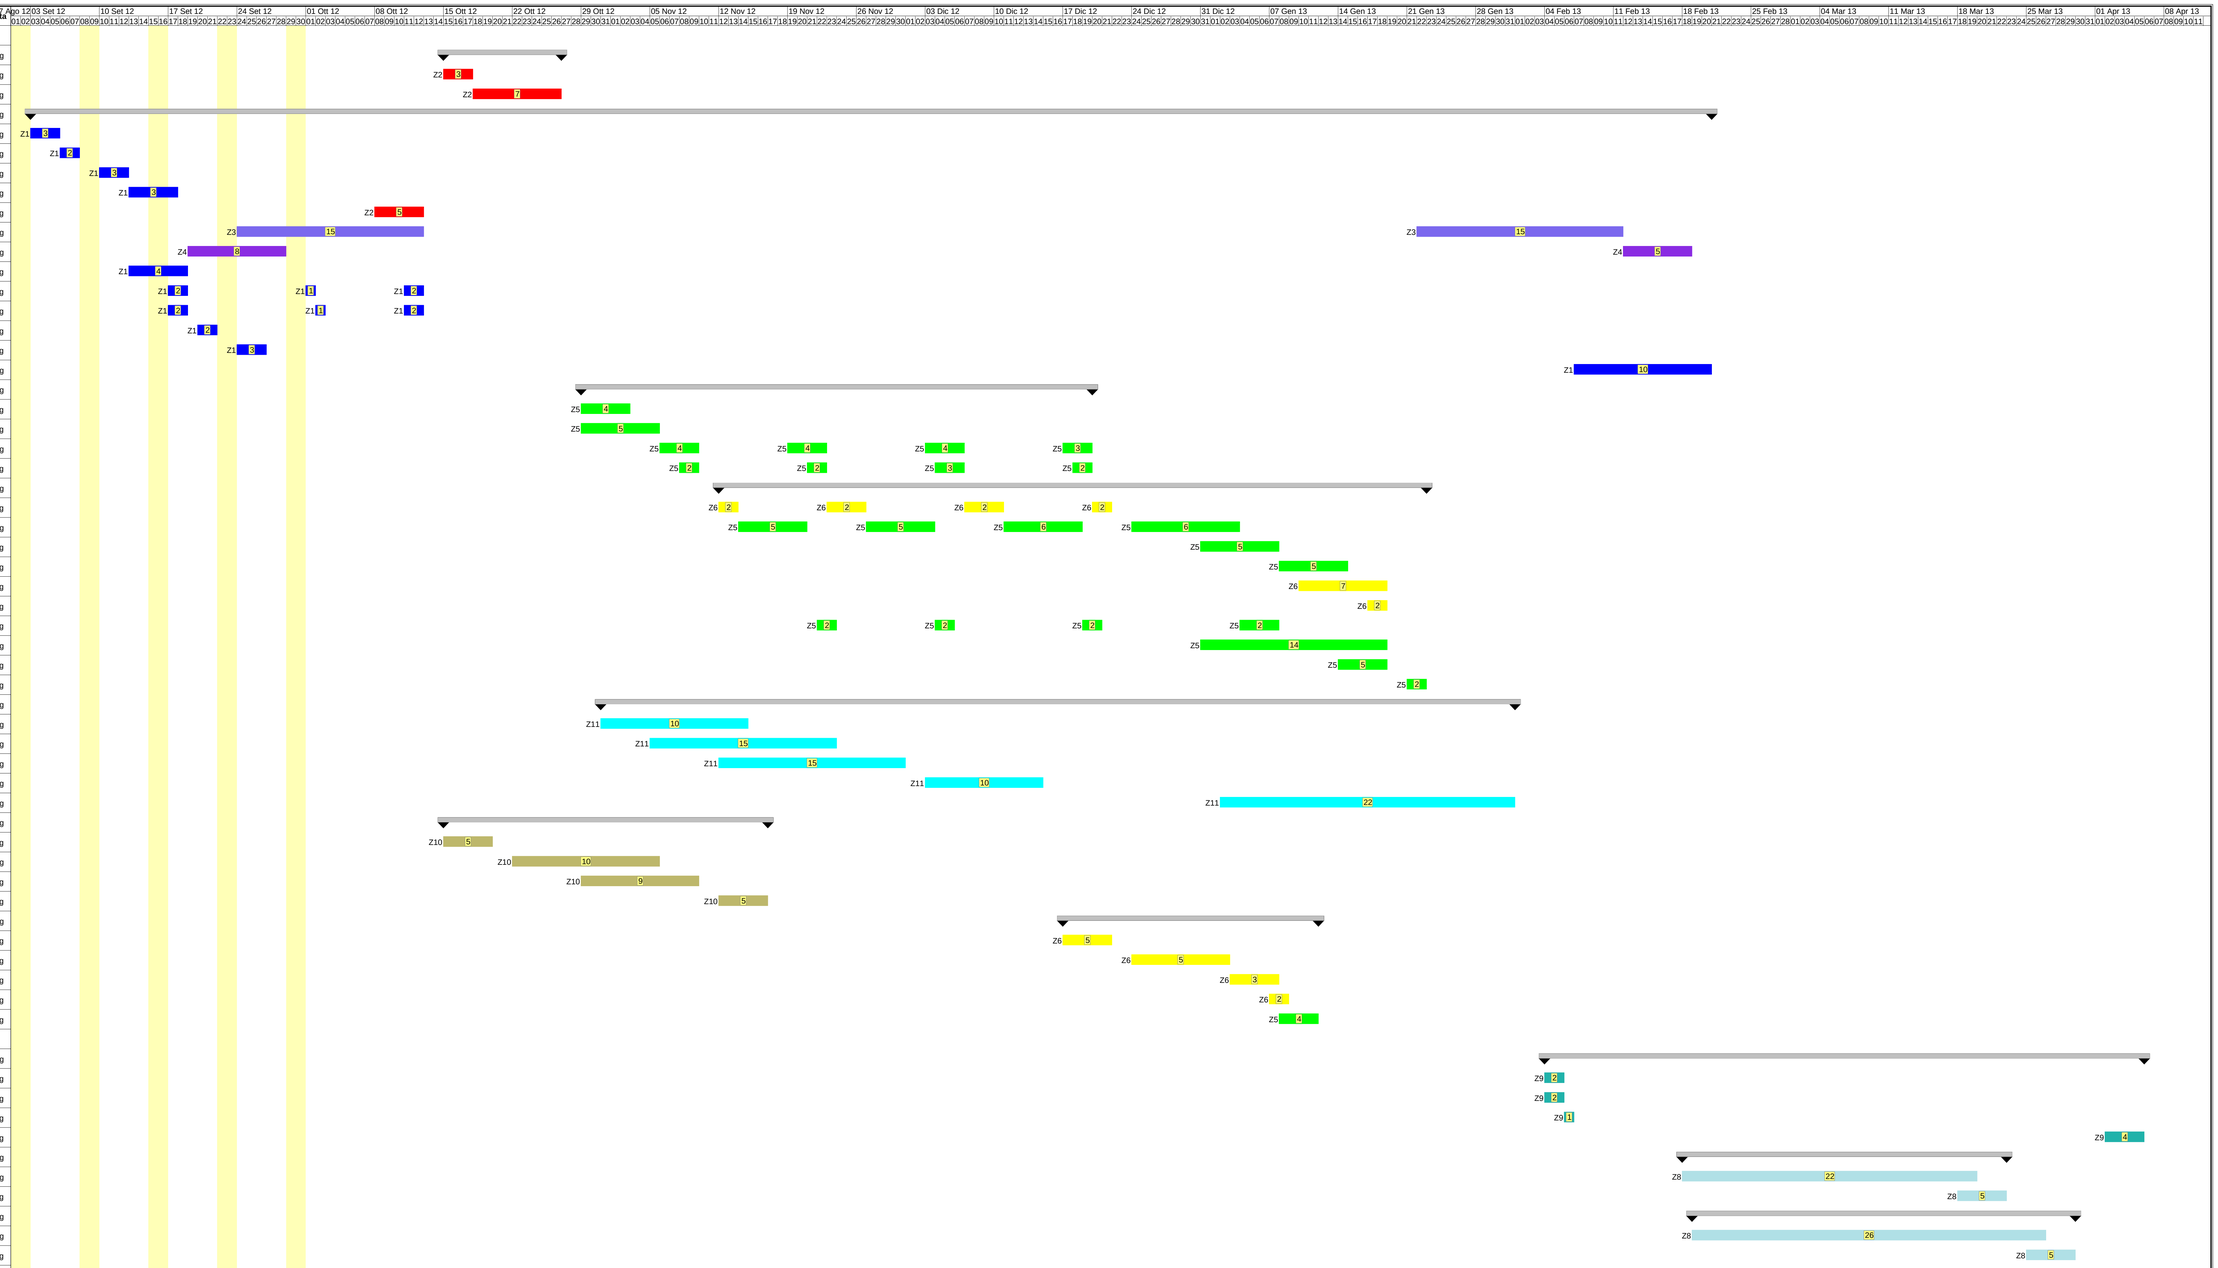
- Z1 = ZONA UNICA
- Z2 = AMIANTO - Rimozioni
- Z3 = Ponteggio
- Z4 = Gru
- Z5 = Coperture
- Z6 = Sottotetto
- Z7 = Testata
- Z8 = Corso Ferrara
- Z9 = Cantiere Corso Ferrara
- Z10 = box cortile
- Z11 = FACCIATE
