Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	38 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	6 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO)	6 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	1 g
Rimozione di serramenti esterni	3 g
Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto	2 g
OPERE INTERNE	15 g
Posa di serramenti esterni	5 g
Realizzazione di tompagnature	5 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	2 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = OPERE IN FACCIATA

Z2 = CORTILE
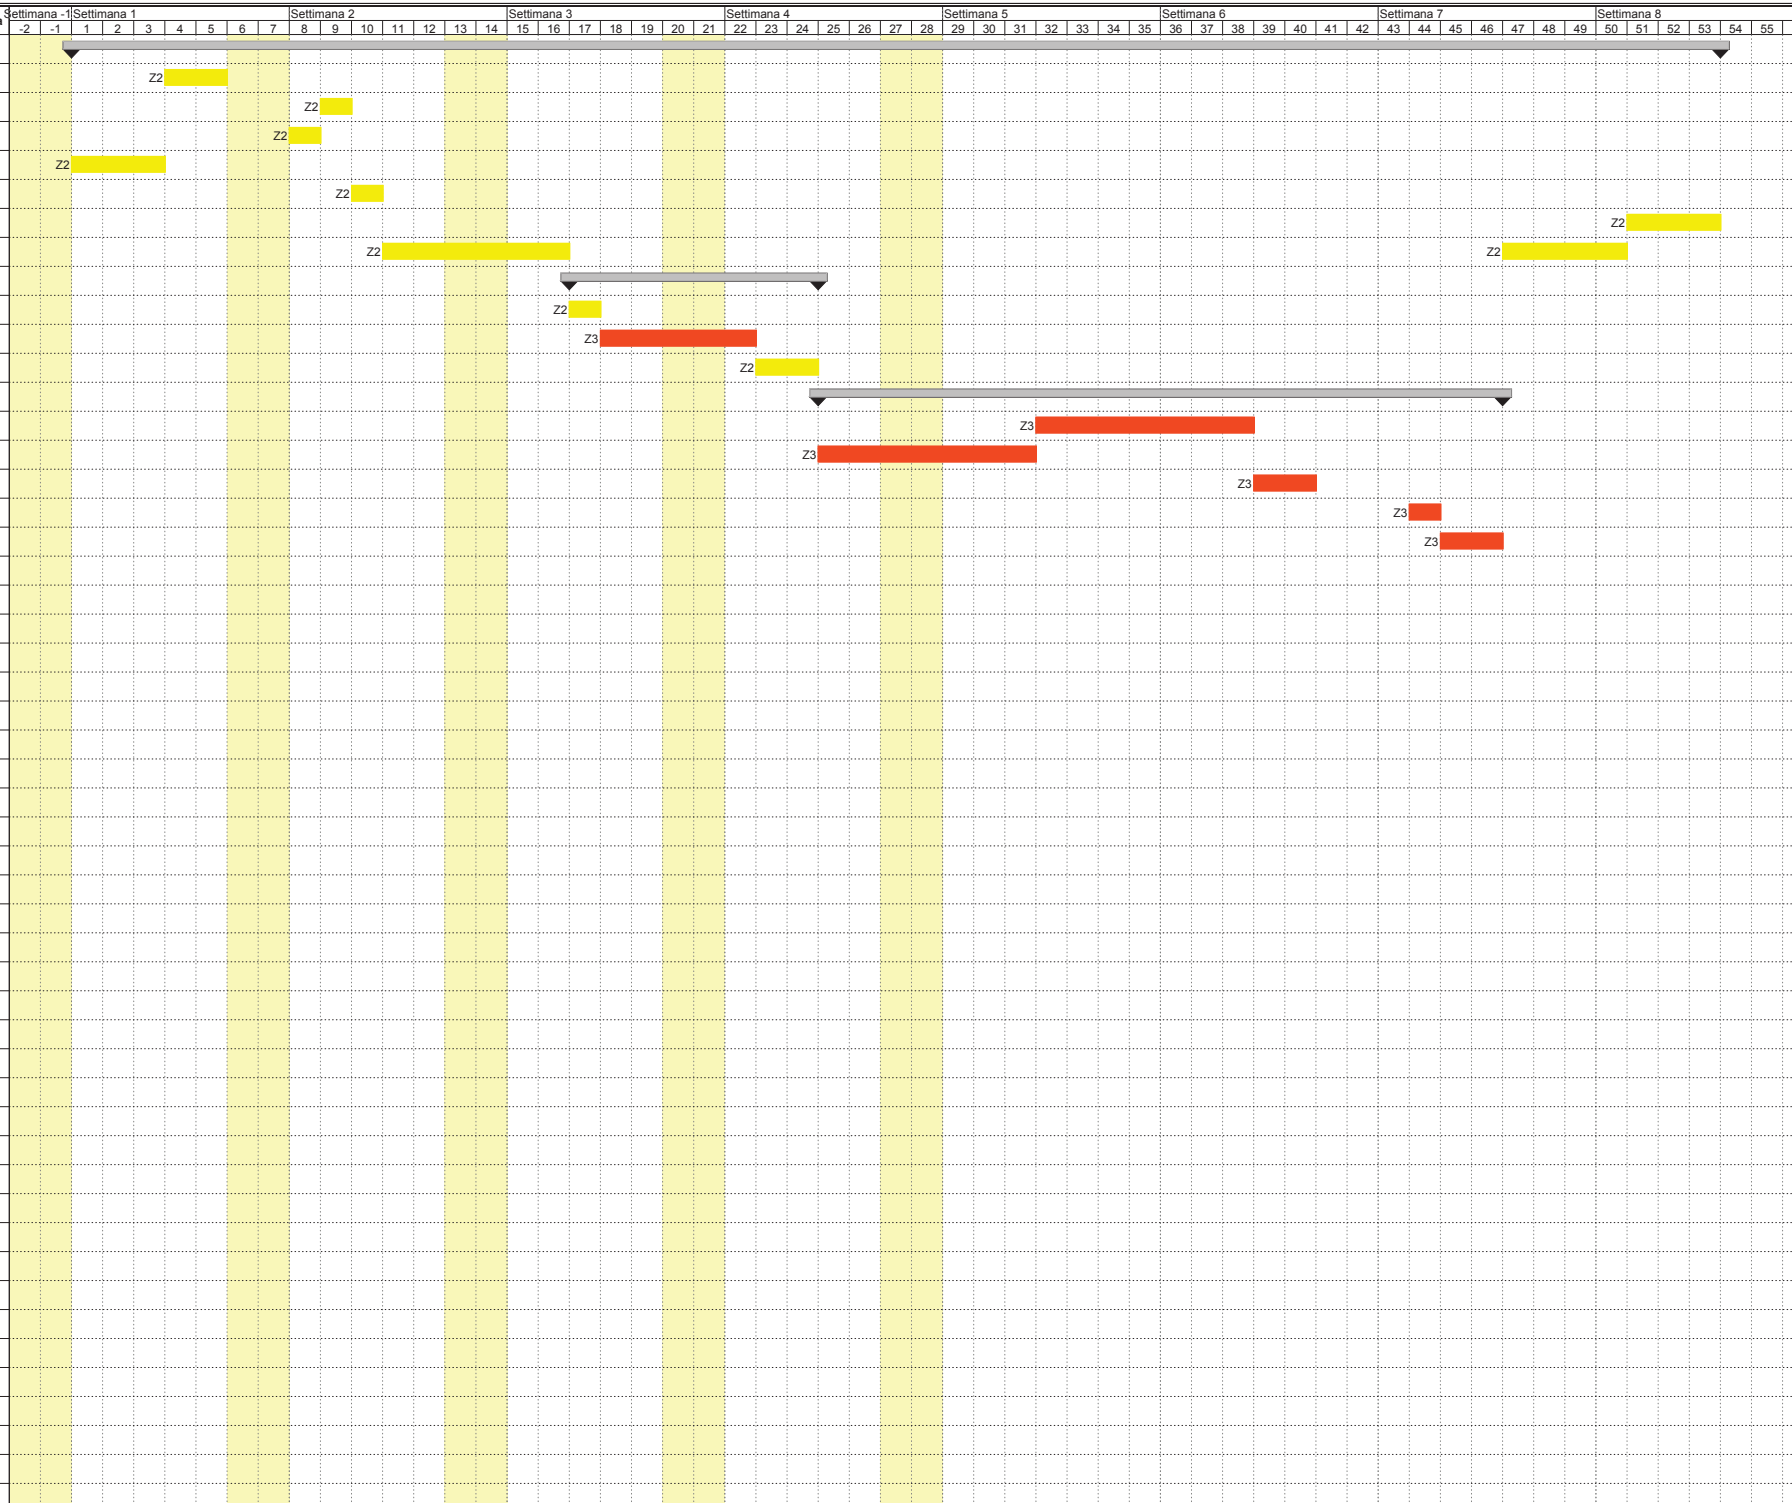
Z3 = ALLOGGIO CUSTODE
