Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	54 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO)	13 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	1 g
Rimozione di macerie contenenti amianto nel sottotetto della	10 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	34 g
Rimozione di parte di copertura in lamiera grecata	2 g
Rimozione di rivestimenti esterni	5 g
Rimozione di lucernari in vetro cemento lesionati	3 g
OPERE IN FACCIATA	25 g
Riposizionamento di copertura in lamiera grecata	2 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	3 g
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g
Impermeabilizzazione di coperture	2 g
lucernari in vetro cemento	3 g

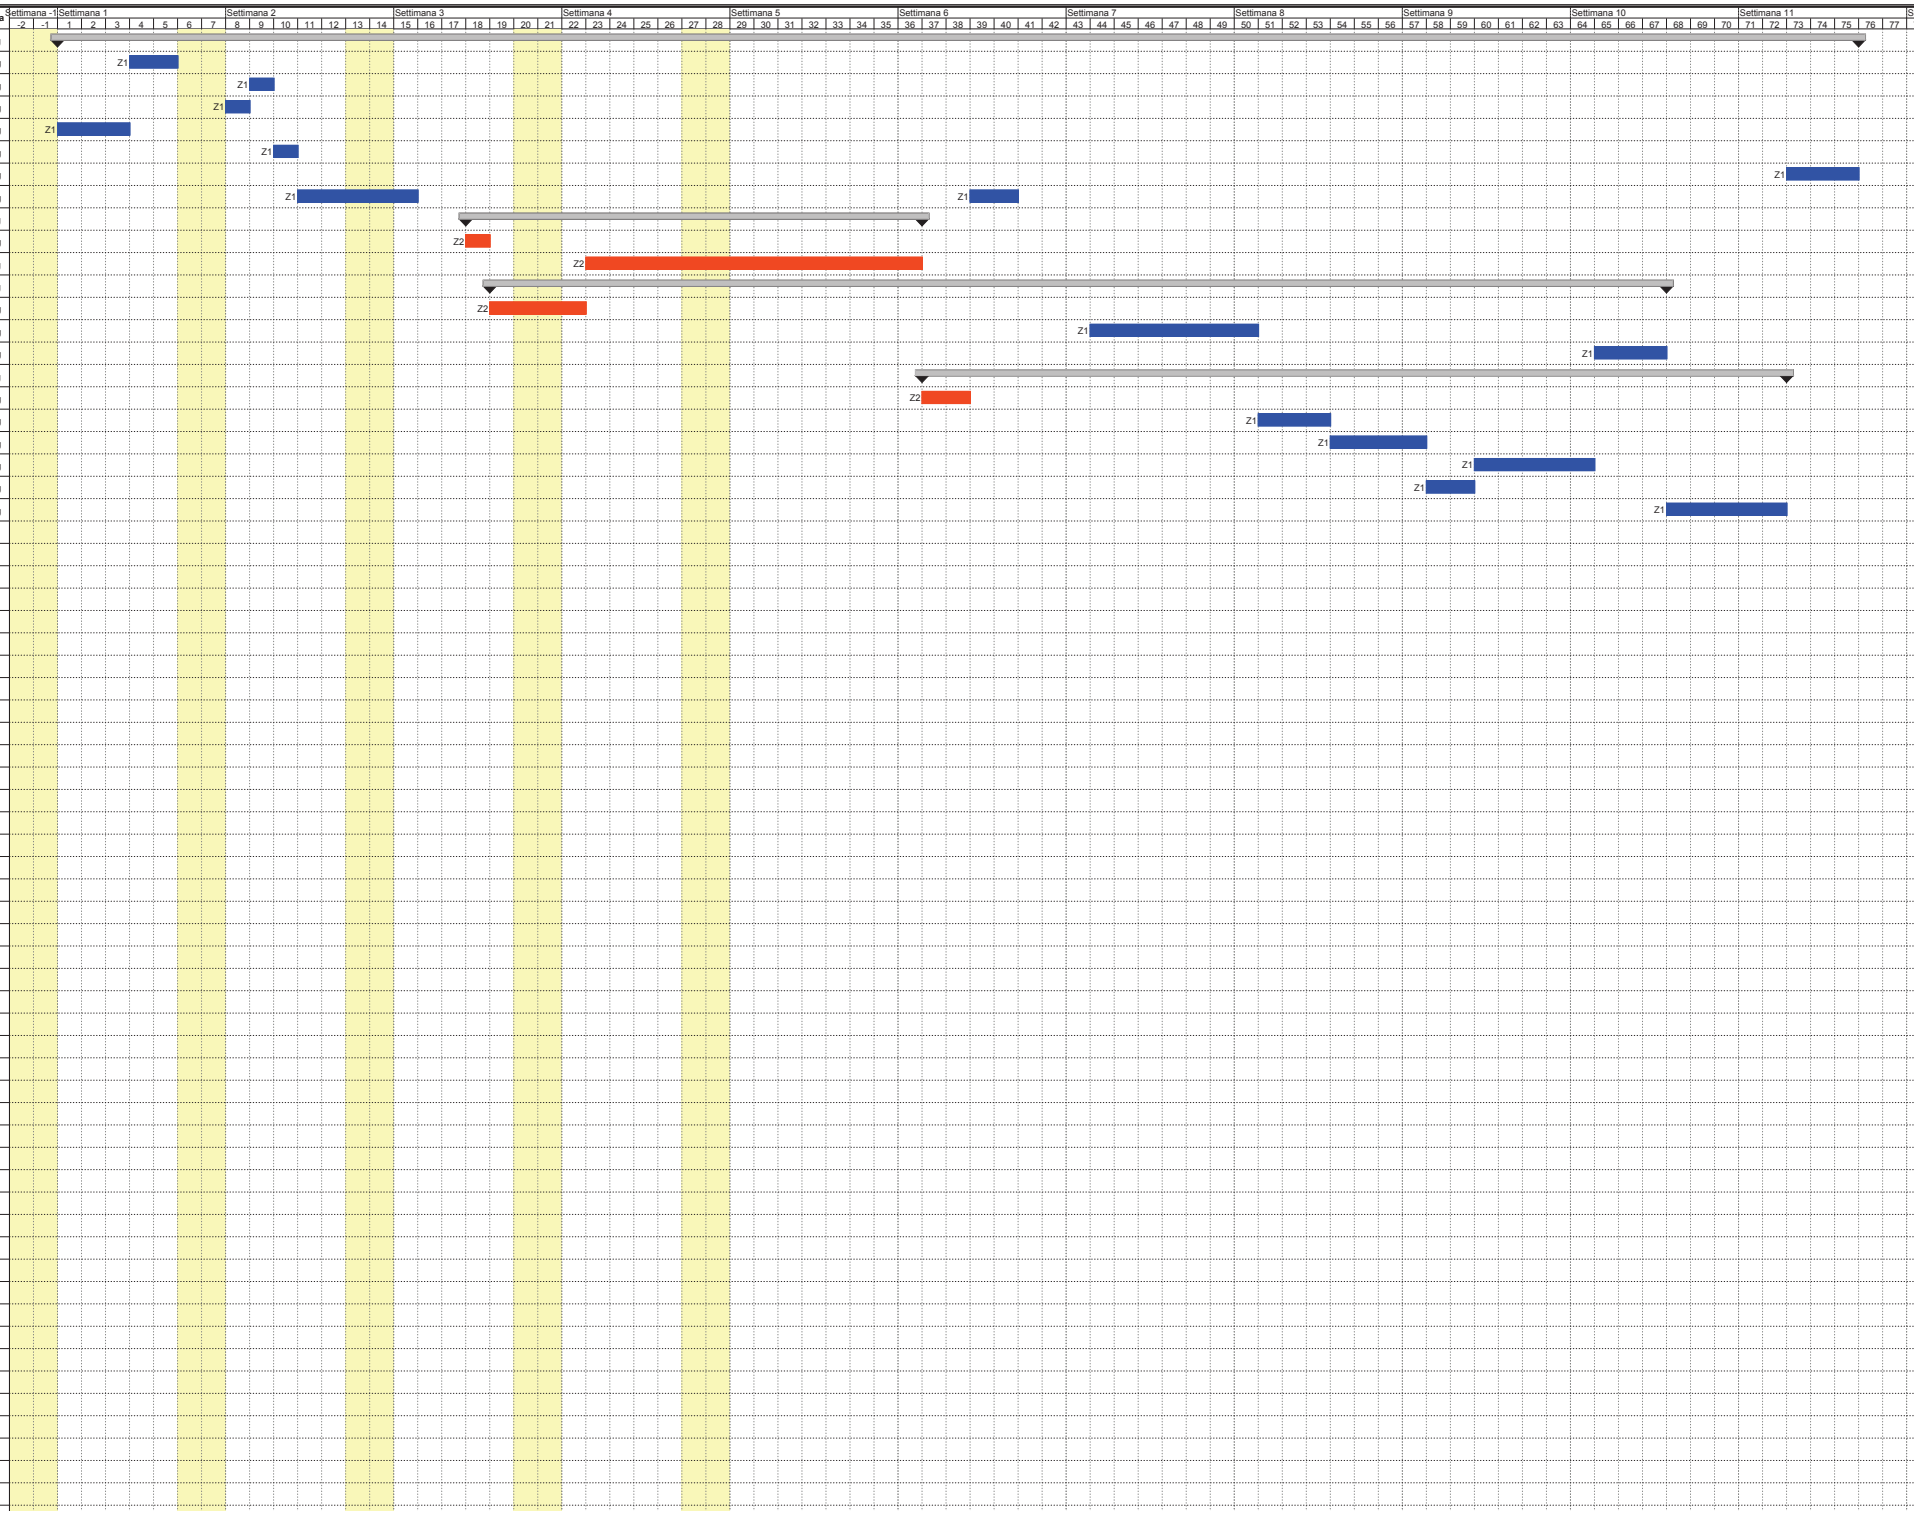

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA ESTERNA

Z2 = SOTTOTETTO
