Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	77 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO)	14 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	1 g
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amiar	5 g
rimozione di tubazione in cemento-amianto	8 g
OPERE EDILI	33 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	6 g
Scavo eseguito a mano	12 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario di scarico fognario	15 g

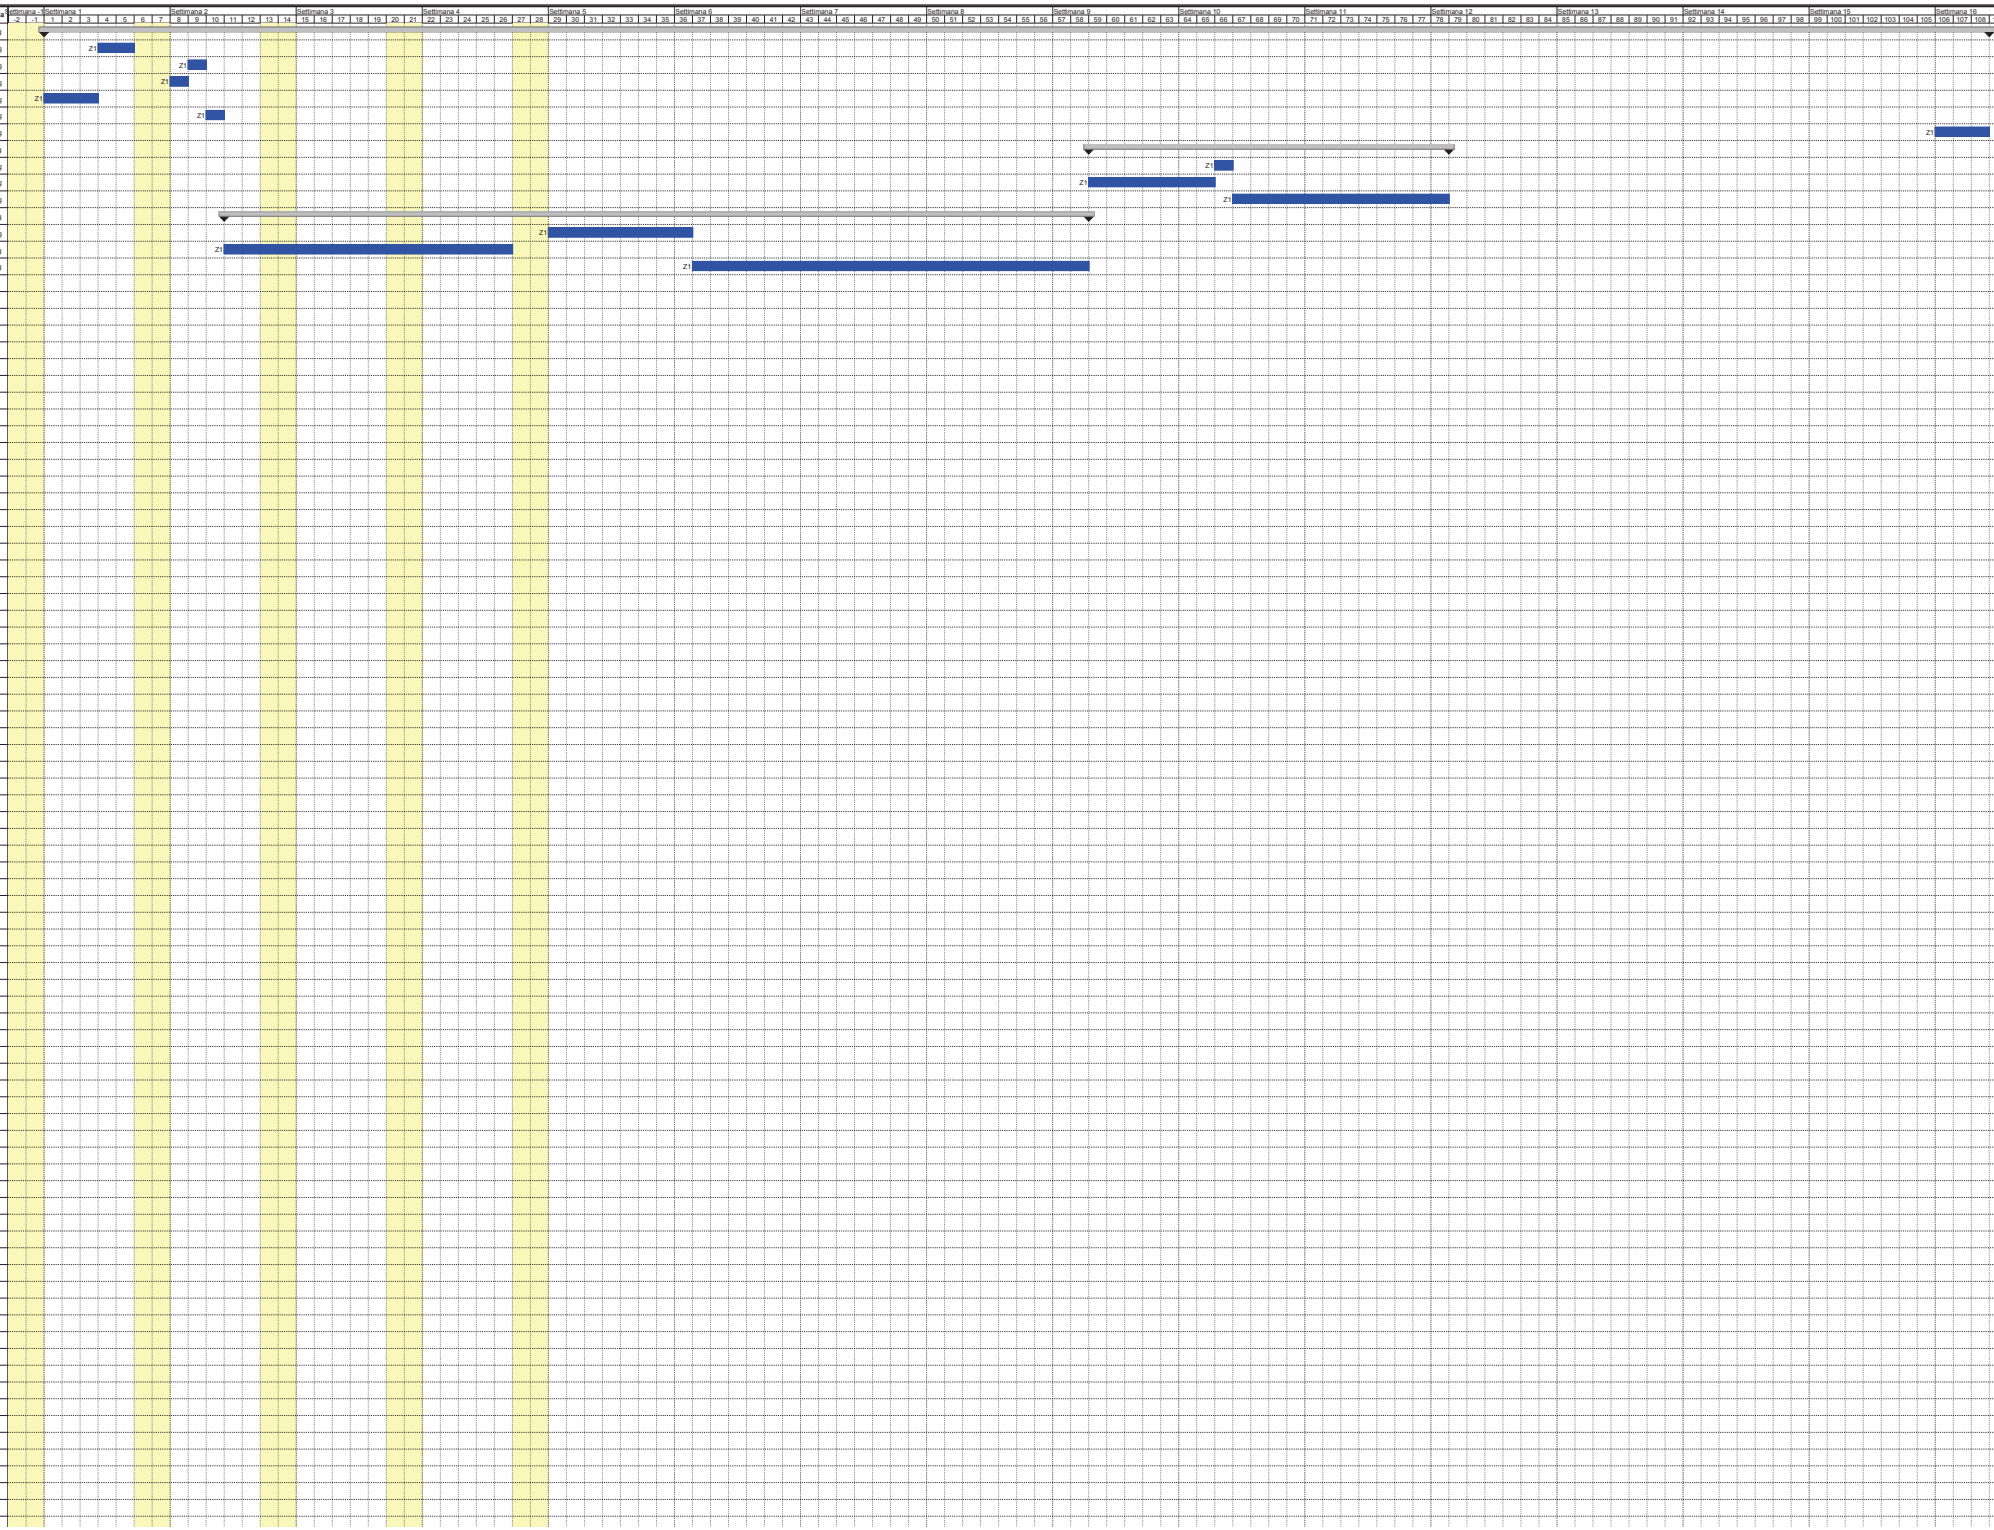

LEGENDA Zona:

Z1 = Cortile
