Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	55 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO)	9 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	2 g
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amiai	3 g
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grol	4 g
OPERE EDILI	45 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	3 g
Demolizione di pareti divisorie	2 g
Realizzazione di divisori interni	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	4 g
OPERE ESTERNE	9 g
Rifacimento di pavimentazione in pietra	5 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g
Posa di conduttura idrica	2 g
Scavo a sezione ristretta	1 g

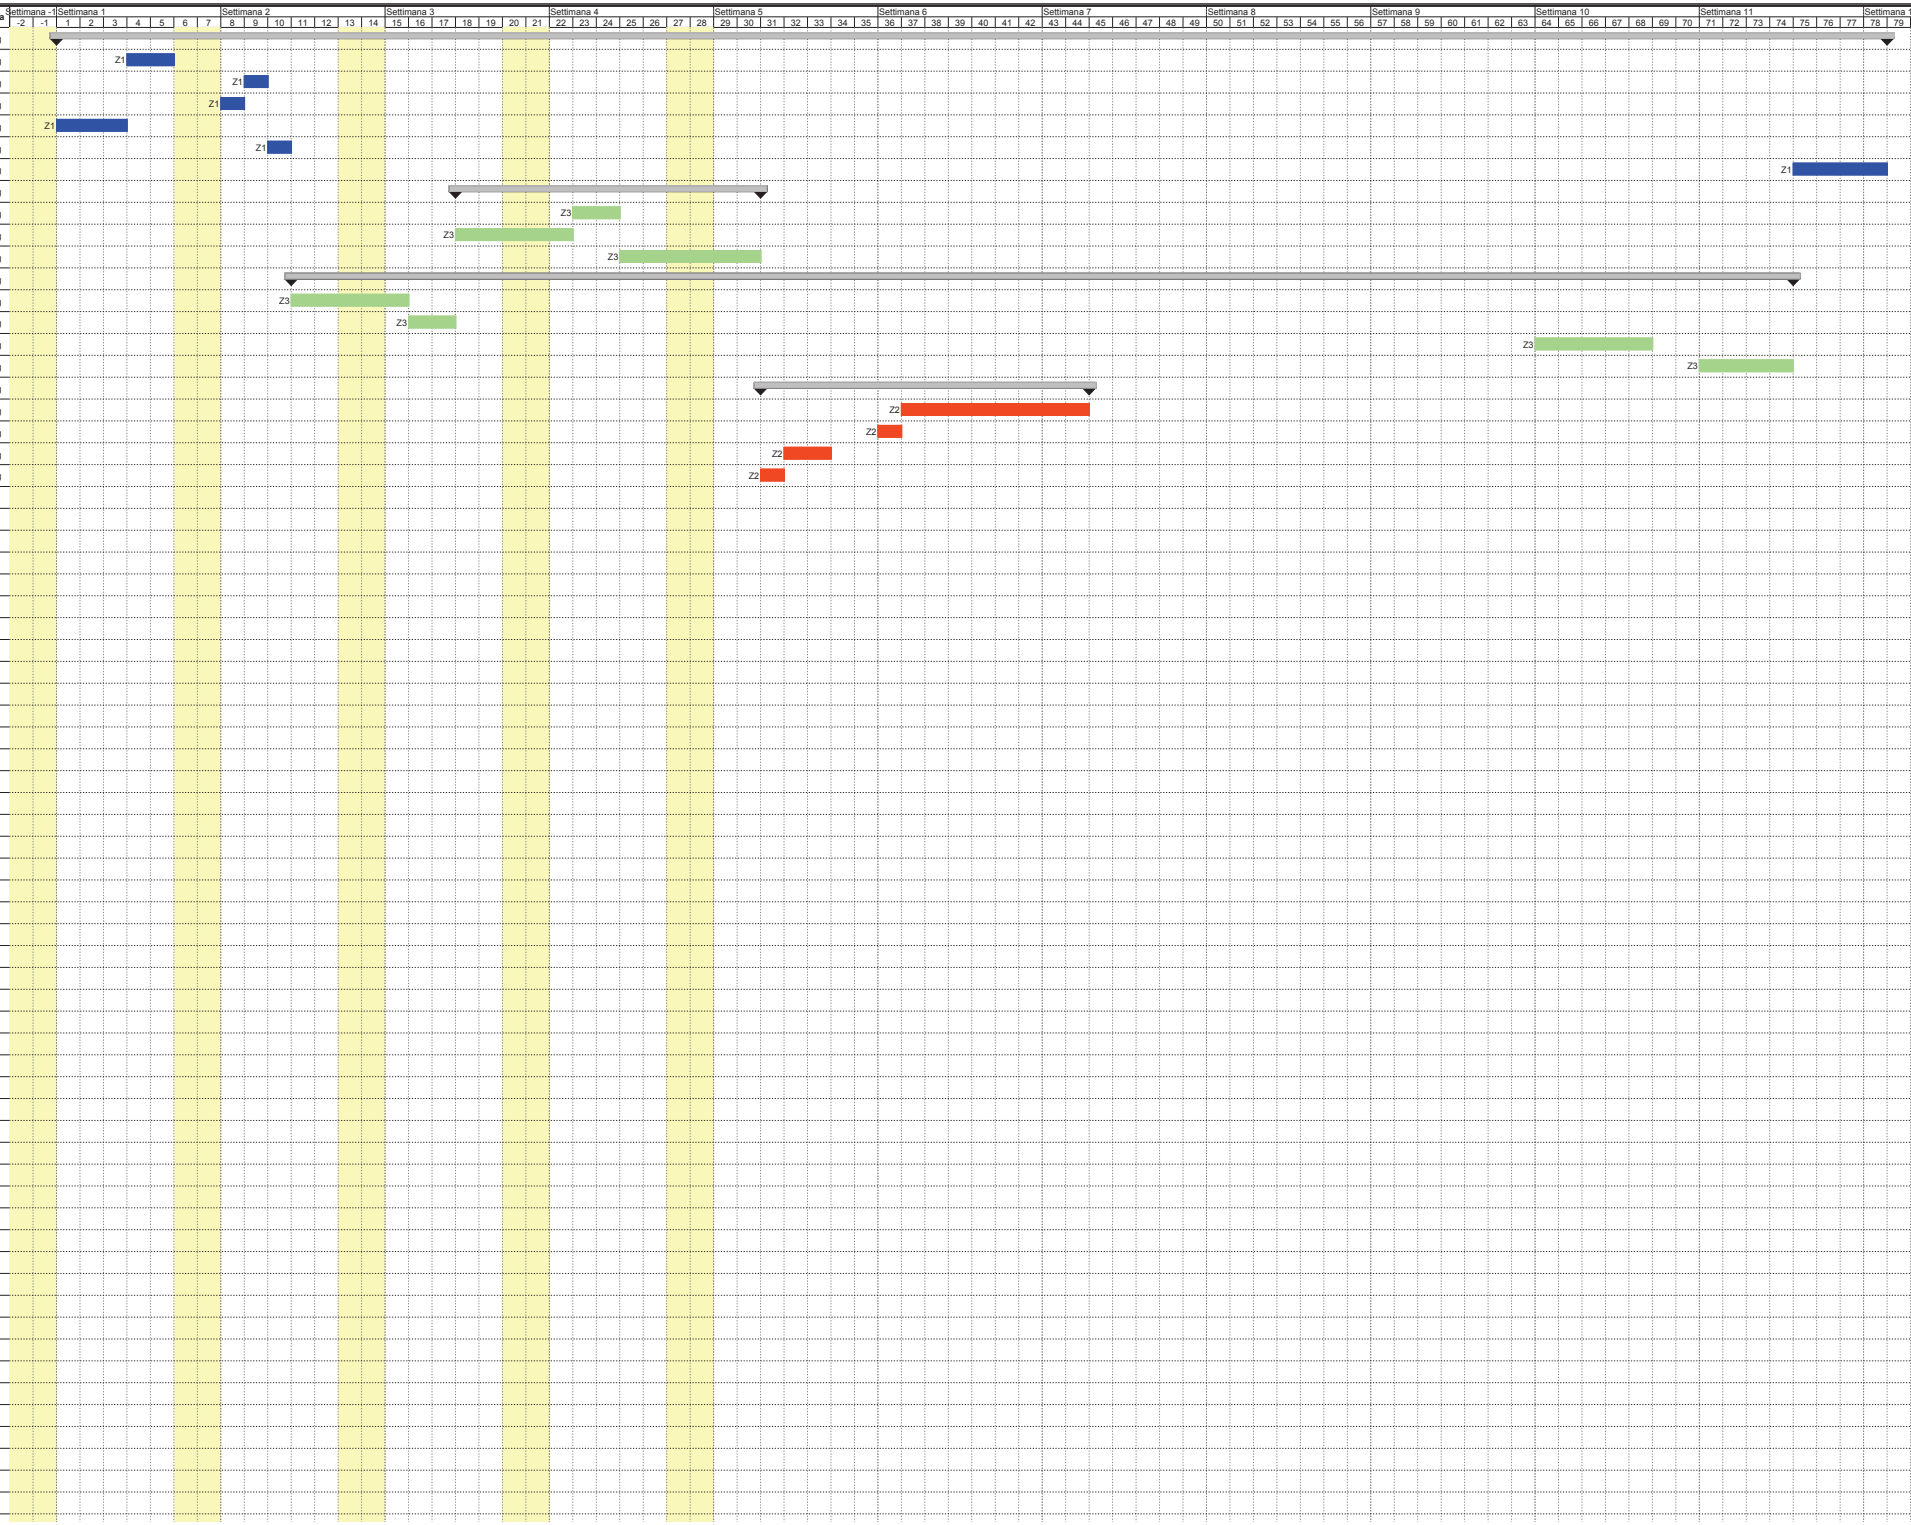

LEGENDA Zona:

Z1 = Cortile area di cantiere

Z2 = area asterna pavimentazione

Z3 = interno edificio
