CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE URBANIZZAZIONI

PRIU - SPINA 1

PARCO PIETRO MENNEA
PROGETTO ESECUTIVO - Lotto 1

PLANIMETRIA FASI DI LAVORO

Scala 1:500	ELABORATO 16	Marzo 2016

PROGETTO: arch. Alessandra AIRES
PROGETTO DEL VERDE: dott. Guido GIORZA

PROGETTO IMPIANTO IRRIGAZIONE:
VERDE PUBBLICO: p.a. Marco CASTIGLIERI

PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IREN : ing. Alessandra PARUZZO

COLLABORATORI:
SETTORE URBANIZZAZIONI: geom. Andrea MARCHISIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE SETTORE TECNICO
arch. Giuseppe SERRA

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: arch. Alberto BARBIERI

CRONOPROGRAMMA LAVORI– DIAGRAMMA DI GANTT

	FASE	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	Durata
1	ALLESTIMENTO CANTIERE									1 sett.
2	PULIZIA ALBERI, ARBUSTI E SCOTICO STRATO SUPERFICIALE									3 sett.
3	SCAVI									3 sett.
4	FORNITURA E POSA CORDOLATURE									4 sett.
5	IMPIANTO IDRICO (irrigazione e installazione "Toret")									3 sett.
6	IMPIANTO ELETTRICO (predisposizione)									3 sett.
7	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIPORTO TERRA									2 sett.
8	PAVIMENTAZIONE AREE									4 sett.
9	PIANTAMENTO PIANTE E ARBUSTI									2 sett.
10	SEMINA PRATO									2 sett.
11	INSTALLAZIONE GIOCHI, ARREDI E PISTA ATLETICA									2 sett.
12	POSA RECINZIONE FISSA "BLU" TRA IL LOTTO 1 E LOTTO 2									1 sett.
13	SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE									1 sett.
14	SMOBILIZZO CANTIERE									1 sett.
	POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI									

Probabile intervento IREN per posa pali illuminazione pubblica

Probabile intervento IREN per attivazione pali precedentemente posati

NB. Tra le fasi **6** e **7**, interverrà IREN, per la posa dei pali di illuminazione con i relativi allacci che verranno alimentati alla fine dei lavori prima della rimozione della recinzione di cantiere (fasi **13** e **14**). Per la realizzazione di questi lavori si ipotizza di consegnare provvisoriamente l'area di cantiere, con apposito verbale della DL, all'Impresa dell'IREN, in modo che possa eseguire le lavorazioni in autonomia e senza interferenze con l'impresa titolare dell'appalto principale.
Per il posizionamento dei pali ci illuminazione si ipotizza una durata di 2 Settimane.
In fase esecutiva, sarà compito del CSE fare le opportune valutazioni del caso in accordo con le imprese e la DL, illustrando i contenuti del PSC, in modo che vengano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza adeguando il cronoprogramma lavori.

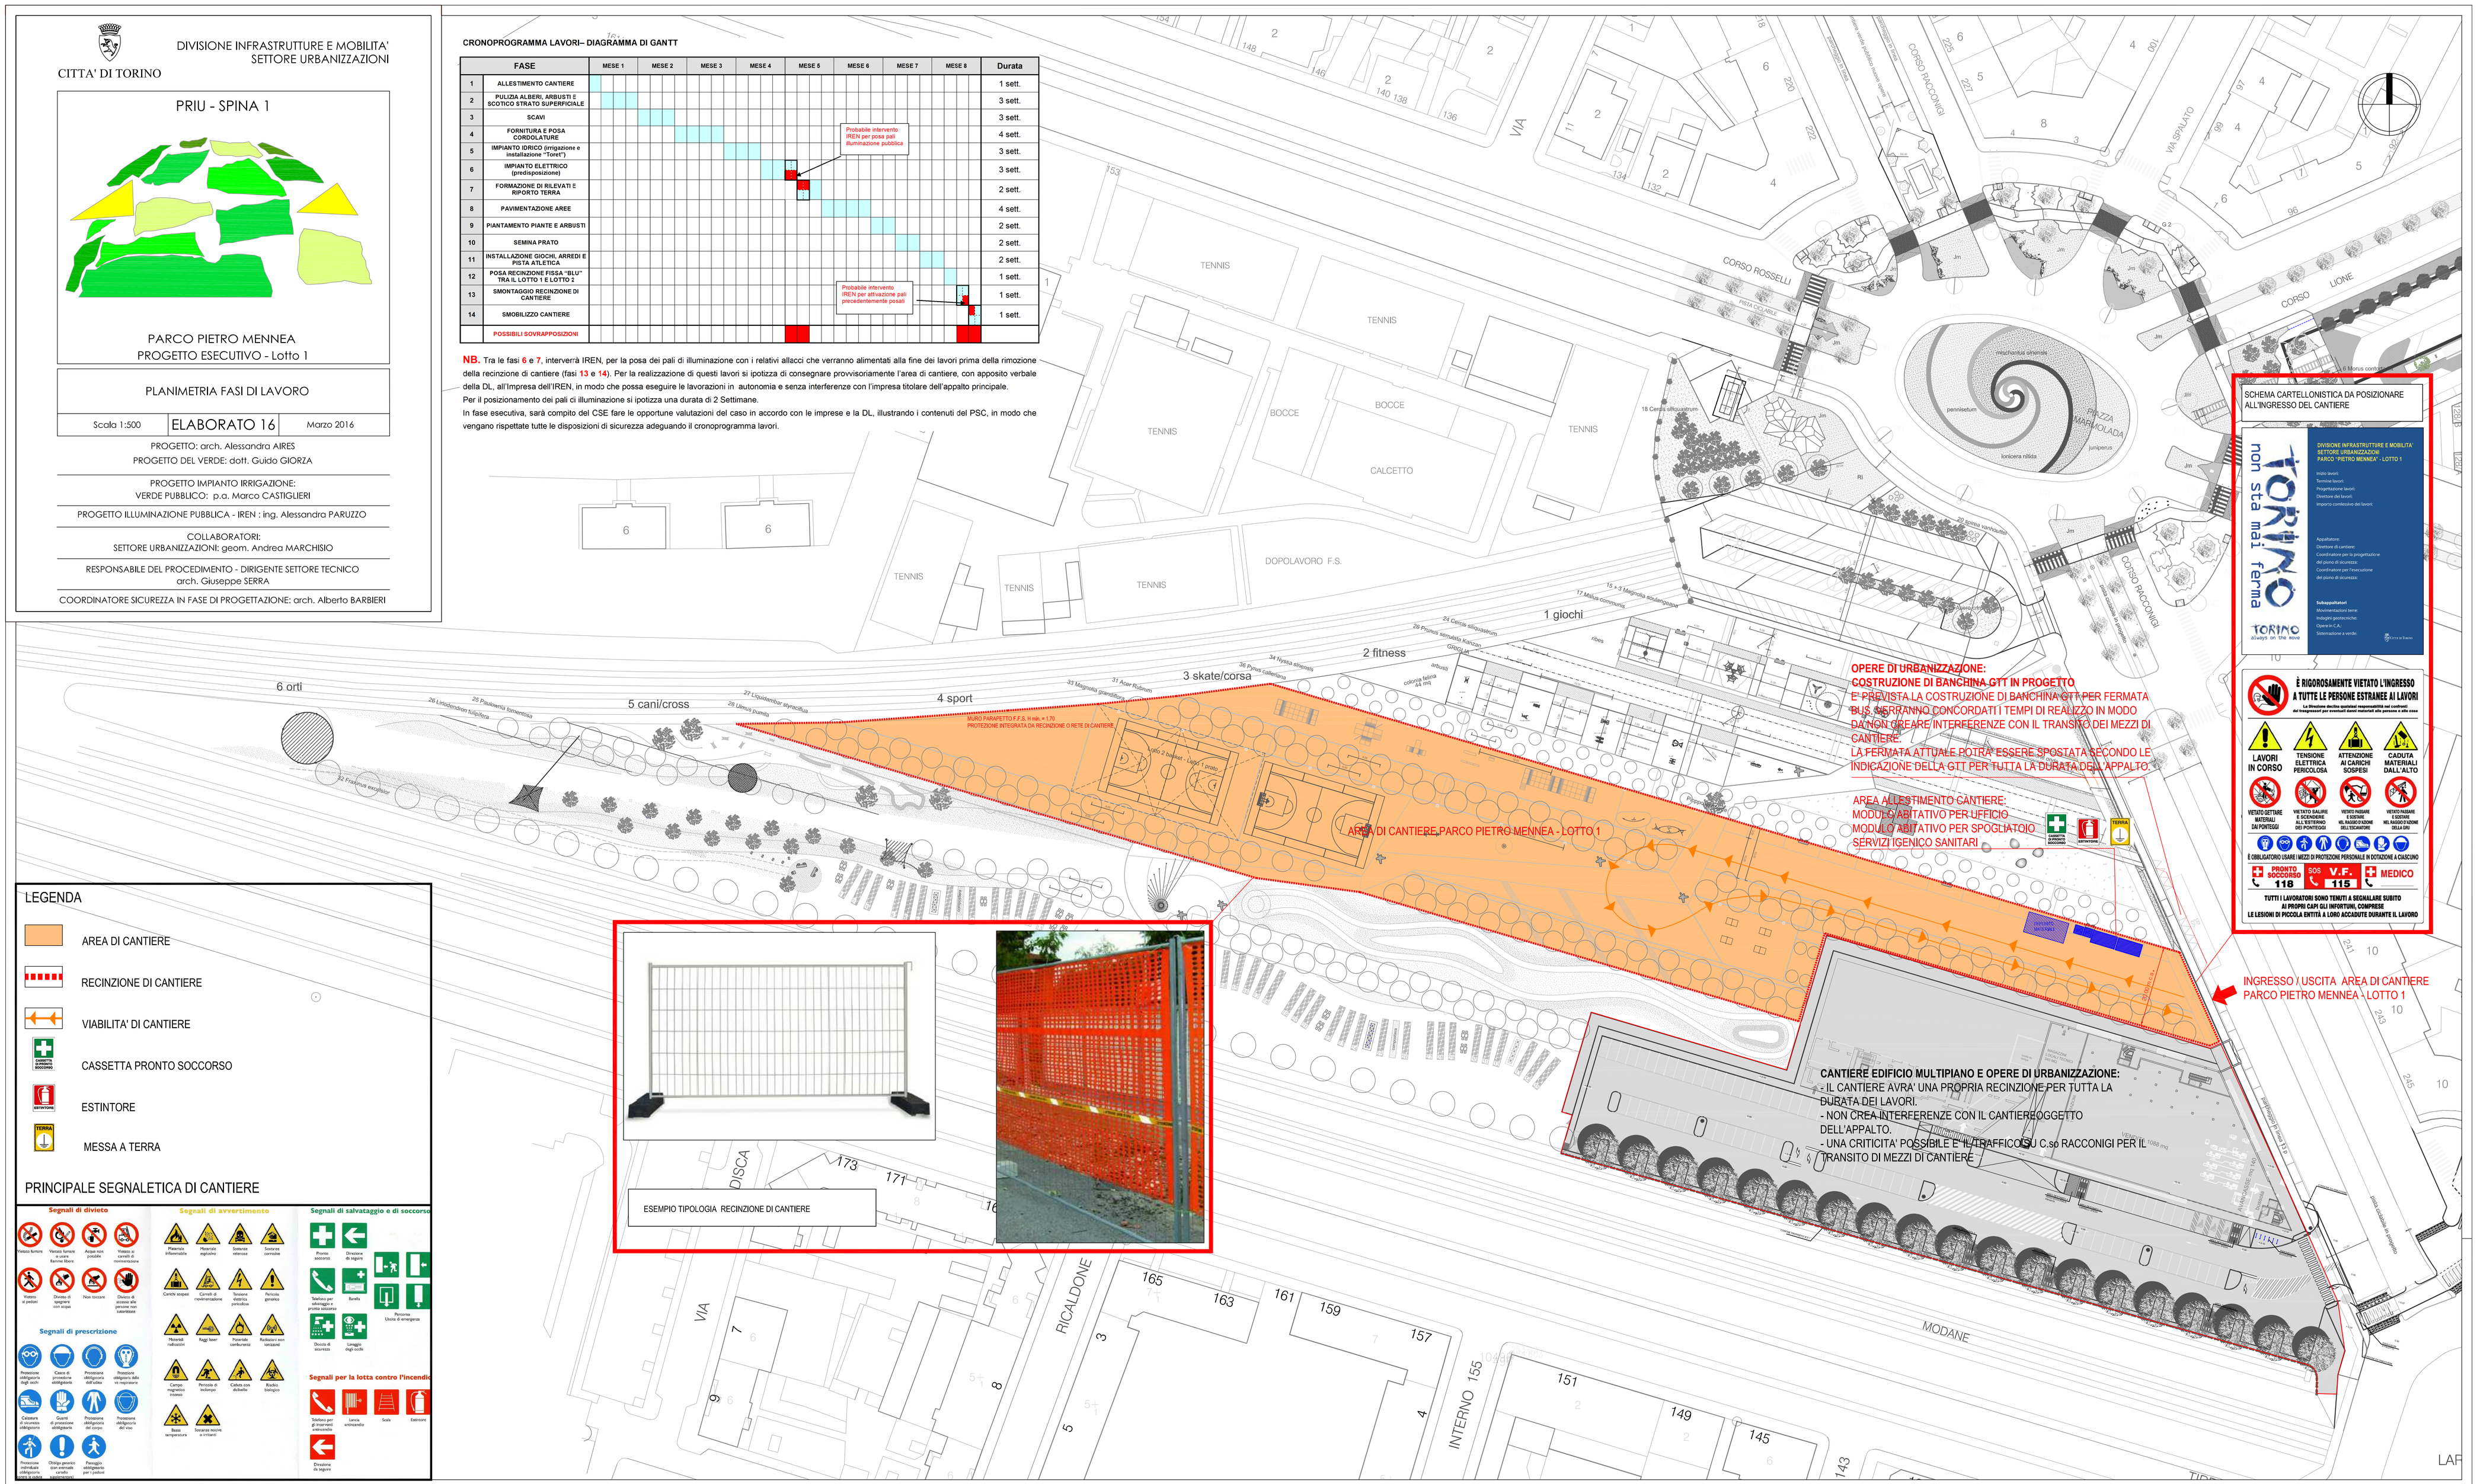

LEGENDA

- AREA DI CANTIERE
- RECINZIONE DI CANTIERE
- VIABILITA' DI CANTIERE
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- ESTINTORE
- MESSA A TERRA

PRINCIPALE SEGNALETICA DI CANTIERE
