CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

N°	ATTIVITA' / FASE LAVORATIVA	GIORNI
	Allestimento del cantiere	
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere, servizi sanitari	
2	Allestimento spogliatoi, zone depositi, stoccaggio, imp. elettrico e messa terra	
	Demolizioni e rimozioni	
3	Rimozione porte interne, serramenti esterni, sanitari, impianti laboratori (cappe, ecc.)	
4	Rimozioni pavimenti sottofondi e rivestimenti bagni ed uffici	
5	Spicconatura intonaci e demolizioni tramezzi	
	Ricostruzioni	
6	Sostituzione finestre in legno bagni 2, 3, 28 e 29	
7	Tramezzatura in mattoni forati pareti divisorie bagni	
8	Impianto idrico-sanitario nuovi bagni	
9	Tramezzatura in mattoni forati pareti divisorie nuovi uffici	
10	Posa telai porte interne	
11	Sottofondi nuovi bagni	
12	Sottofondi nuovi uffici	
13	Rinzaffo e intonaco nuovi bagni ed uffici	
14	Pavimenti e rivestimenti nuovi bagni	
15	Sostituzione e revisione serramenti esterni uffici	
16	Pavimenti nuovi uffici	
17	Controsoffitti dei bagni	
18	Decorazioni interne	
19	Posa sanitari	
20	Posa porte bagni in alluminio, porte REI, porta interne in legno	
21	Adeguamento impianti (elettrici, fonia, trasmissione dati, fluidodinamici, ecc.)	
22	Controllo rivestimento travertino e parti aggettanti su facciate esterne	
23	**Pulizia cantiere**	

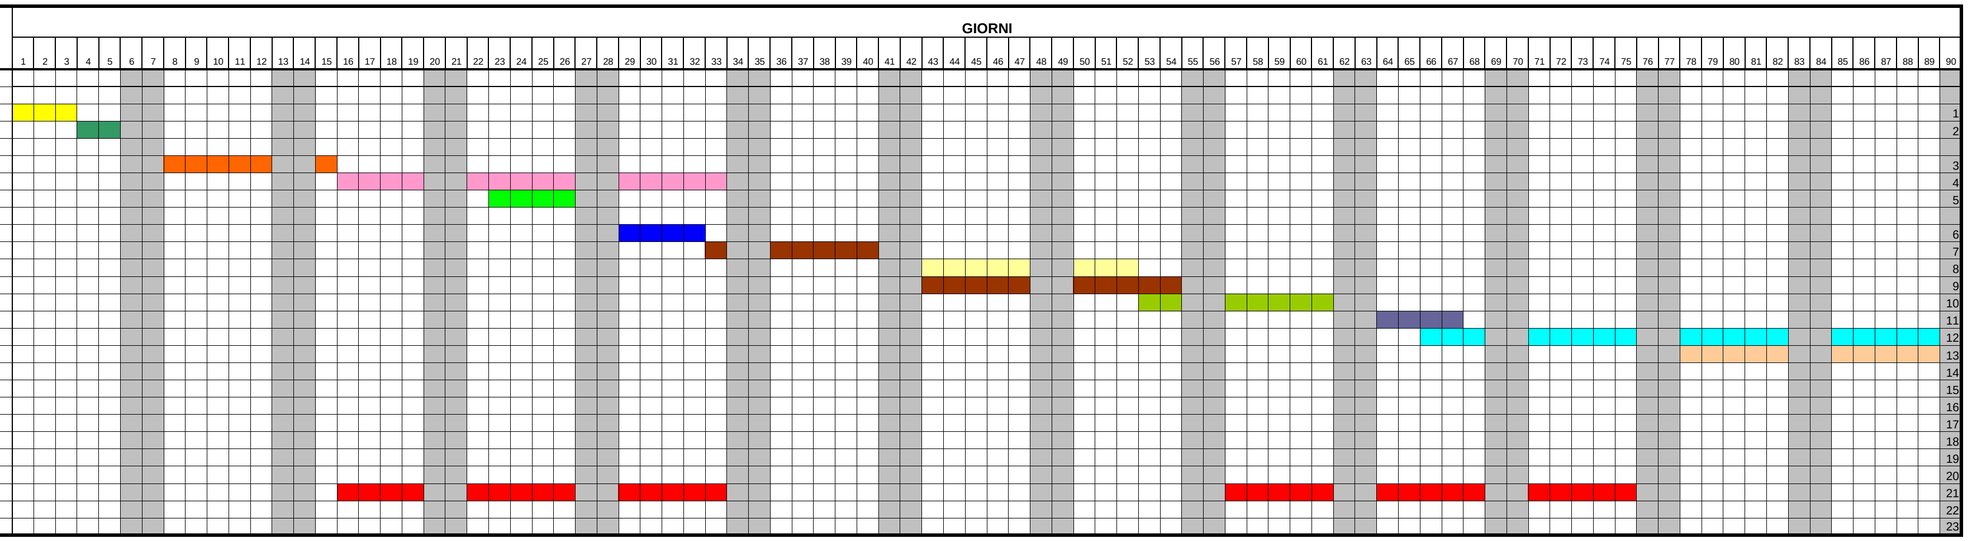
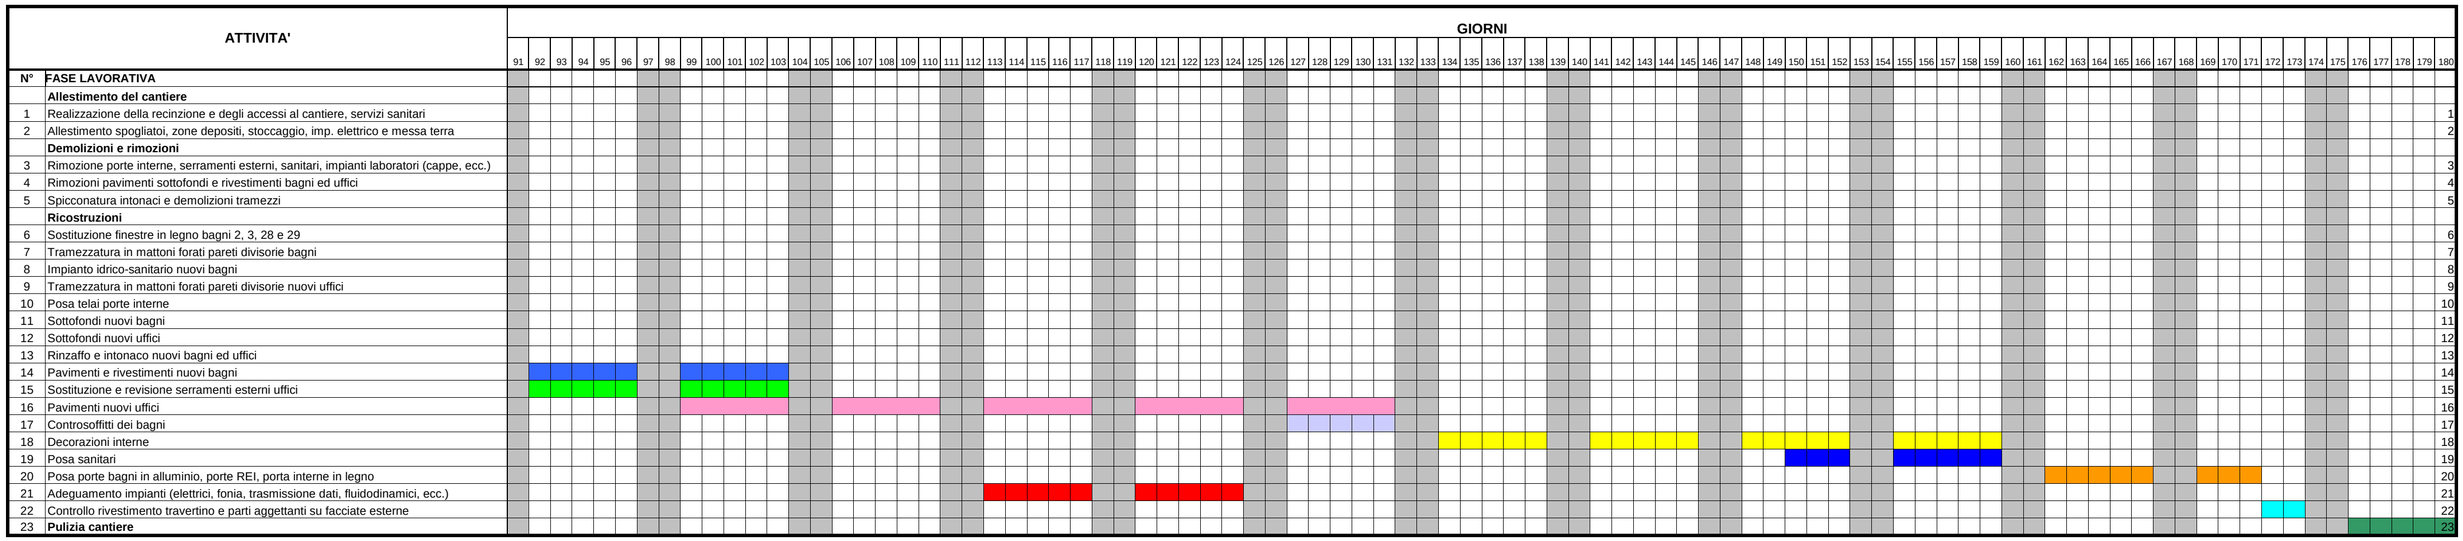
N°	ATTIVITA' / FASE LAVORATIVA	GIORNI
	Allestimento del cantiere	
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere, servizi sanitari	
2	Allestimento spogliatoi, zone depositi, stoccaggio, imp. elettrico e messa terra	
	Demolizioni e rimozioni	
3	Rimozione porte interne, serramenti esterni, sanitari, impianti laboratori (cappe, ecc.)	
4	Rimozioni pavimenti sottofondi e rivestimenti bagni ed uffici	
5	Spicconatura intonaci e demolizioni tramezzi	
	Ricostruzioni	
6	Sostituzione finestre in legno bagni 2, 3, 28 e 29	
7	Tramezzatura in mattoni forati pareti divisorie bagni	
8	Impianto idrico-sanitario nuovi bagni	
9	Tramezzatura in mattoni forati pareti divisorie nuovi uffici	
10	Posa telai porte interne	
11	Sottofondi nuovi bagni	
12	Sottofondi nuovi uffici	
13	Rinzaffo e intonaco nuovi bagni ed uffici	
14	Pavimenti e rivestimenti nuovi bagni	
15	Sostituzione e revisione serramenti esterni uffici	
16	Pavimenti nuovi uffici	
17	Controsoffitti dei bagni	
18	Decorazioni interne	
19	Posa sanitari	
20	Posa porte bagni in alluminio, porte REI, porta interne in legno	
21	Adeguamento impianti (elettrici, fonia, trasmissione dati, fluidodinamici, ecc.)	
22	Controllo rivestimento travertino e parti aggettanti su facciate esterne	
23	**Pulizia cantiere**
