CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE URBANIZZAZIONI

PRIU - SPINA 1

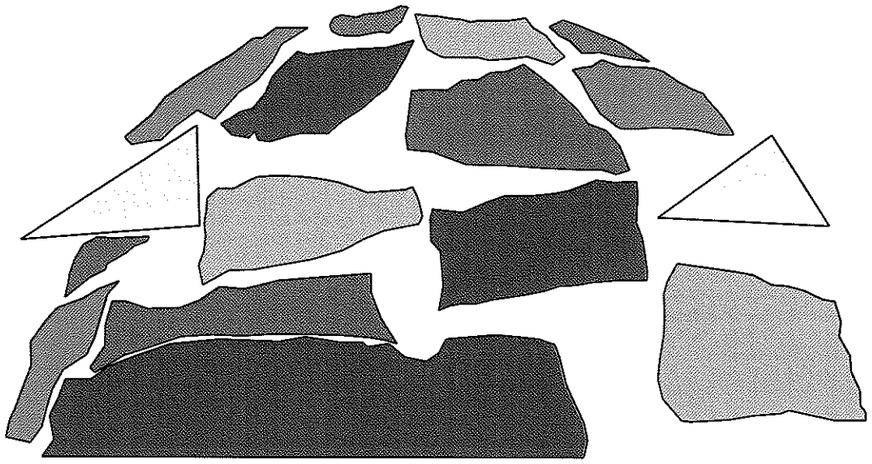

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZA MARMOLADA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

	19	Marzo 2011

PROGETTO: arch. Alessandra AIRES

PROGETTO DEL VERDE: dott. Guido GIORZA

PROGETTO IMPIANTO IRRIGAZIONE:
VERDE PUBBLICO: p.a. Marco CASTIGLIERI

COLLABORATORI:
VIABILITA': arch. Fabrizio VOLTOLINI
SETTORE URBANIZZAZIONI: geom. Andrea MARCHISIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE SETTORE TECNICO
arch. Giuseppe SERRA

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: arch. Marco ROLANDO

Piazza Marmolada

CRONOPROGRAMMA GENERALE DELLE FASI DI CANTIERE

0 30 60 90 120 150 180 210 240

		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese					
N. Fase	***Localizzazione***	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	1 s.	2 s.	3 s.	4 s.	**Settimane lavorative per ogni macroarea**	**Totale Uomini/giorno**
0	**Installazione del cantiere**	8																8		8			8			8			8					6	48
A	**Parcheggio - Fronte sud-ovest**																																	16	
	Demolizioni - Rimozioni	20	20																																40
	Scavi di sbancamento			30	30	30																													60
	Realizzazione di cavidotti per I.P.						20	20	20																										60
	Smaltimento acque meteoriche									20	20	20																							60
	Realizzazione di sottofondi											20	20	20	20																				80
	Pavimentazioni e asfaltature														20	20	20																		60
B	**Pista ciclabile - Fronte sud-ovest**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																	10																	10
	Scavi di sbancamento																		10																10
	Realizzazione di cavidotti																			10															10
	Realizzazione di sottofondi																				10														10
	Pavimentazioni e asfaltature																					10													10
C	**Rotatoria - Area centrale**																			10														5	
	Demolizioni - Rimozioni																				10														10
	Scavi di sbancamento																					10													10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																						10												10
	Realizzazione di sottofondi																							10											10
	Pavimentazioni e asfaltature																								10										10
D	**Banchina centrale - Corso Rosselli**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																						10												10
	Scavi di sbancamento																							10											10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																								10										10
	Realizzazione di sottofondi																									10									10
	Pavimentazioni e asfaltature																										10								10
E	**Settore nord - ovest**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																									10									10
	Scavi di sbancamento																										10								10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																											10							10
	Realizzazione di sottofondi																												10						10
	Pavimentazioni e asfaltature																													10					10
F	**Banchina centrale - Corso Racconigi**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																												10						10
	Scavi di sbancamento																													10					10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																														10				10
	Realizzazione di sottofondi																															10			10
	Pavimentazioni e asfaltature																																10		10
G	**Settore nord**																																	5	

	Demolizioni - Rimozioni																	10																	10
	Scavi di sbancamento																		10																10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																			10															10
	Realizzazione di sottofondi																				10														10
	Pavimentazioni e asfaltature																					10													10
H	**Settore nord-est**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																				10														10
	Scavi di sbancamento																					10													10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																						10												10
	Realizzazione di sottofondi																							10											10
	Pavimentazioni e asfaltature																								10										10
L	**Banchina centrale - Corso Lione**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																						10												10
	Scavi di sbancamento																							10											10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																								10										10
	Realizzazione di sottofondi																									10									10
	Pavimentazioni e asfaltature																										10								10
M	**Settore est**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																											15							15
	Scavi di sbancamento																												15						15
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																													15					15
	Realizzazione di sottofondi																														15				15
	Pavimentazioni e asfaltature																															15			15
N	**Banchina centrale - C.so Rosselli**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																														10				10
	Scavi di sbancamento																															10			10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																																10		10
	Realizzazione di sottofondi																																	10	10
	Pavimentazioni e asfaltature																																	10	10
O	**Settore sud-est**																																	5	
	Demolizioni - Rimozioni																	10																	10
	Scavi di sbancamento																		10																10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																			10															10
	Realizzazione di sottofondi																				10														10
	Pavimentazioni e asfaltature																					10													10
P	**Banchina centrale - Corso Racconigi**																				10													5	
	Demolizioni - Rimozioni																					10													10
	Scavi di sbancamento																						10												10
	Realizzazione di cavidotti per I.P.																							10											10
	Realizzazione di sottofondi																								10										10
	Pavimentazioni e asfaltature																									10									10
Q	**Opere di sistemazione a verde**																																	16	0
R	**Smantellamento del cantiere**																8					8		8			8			8			8	6	48
	Totale uomini/giorno per ogni settimana lavorativa	28	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	20	20	40	20	28	38	30	48	60	68	58	68	40	53	53	25	53	53	20	20	38	1101	**1101**

N.B. 1	Considerata la tipologia delle opere da eseguirsi e la compresenza sull'area di cantieri gestiti da terzi - passante ferroviario e interventi programmati di urbanizzazione - la successione temporale dei vari interventi dovrà essere concordata volta per volta con l'ufficio Regia Cantieri. Il presente prospetto risulta pertanto meramente indicativo.
