CITTA' DI TORINO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE



PROGETTO ESECUTIVO

PARZIALE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE
VIALE DELLA SPINA
DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO
ATTRAVERSAMENTI VIA CERVINO E VIA VALPRATO

Direttore di Direzione:	ing. Roberto BERTASIO
Gruppo di progettazione: arch. Gerino PALMIERI geom. Ciro MELCHIONNA geom. Federico STALTERI	Progettista: ing. Amerigo STROZZIERO Dirigente Servizio Ponti Vie d'Acqua e Infrastrutture Responsabile del Procedimento: ing. Giorgio MARENGO
DATA: marzo 2014	SCALA:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PE_SC02
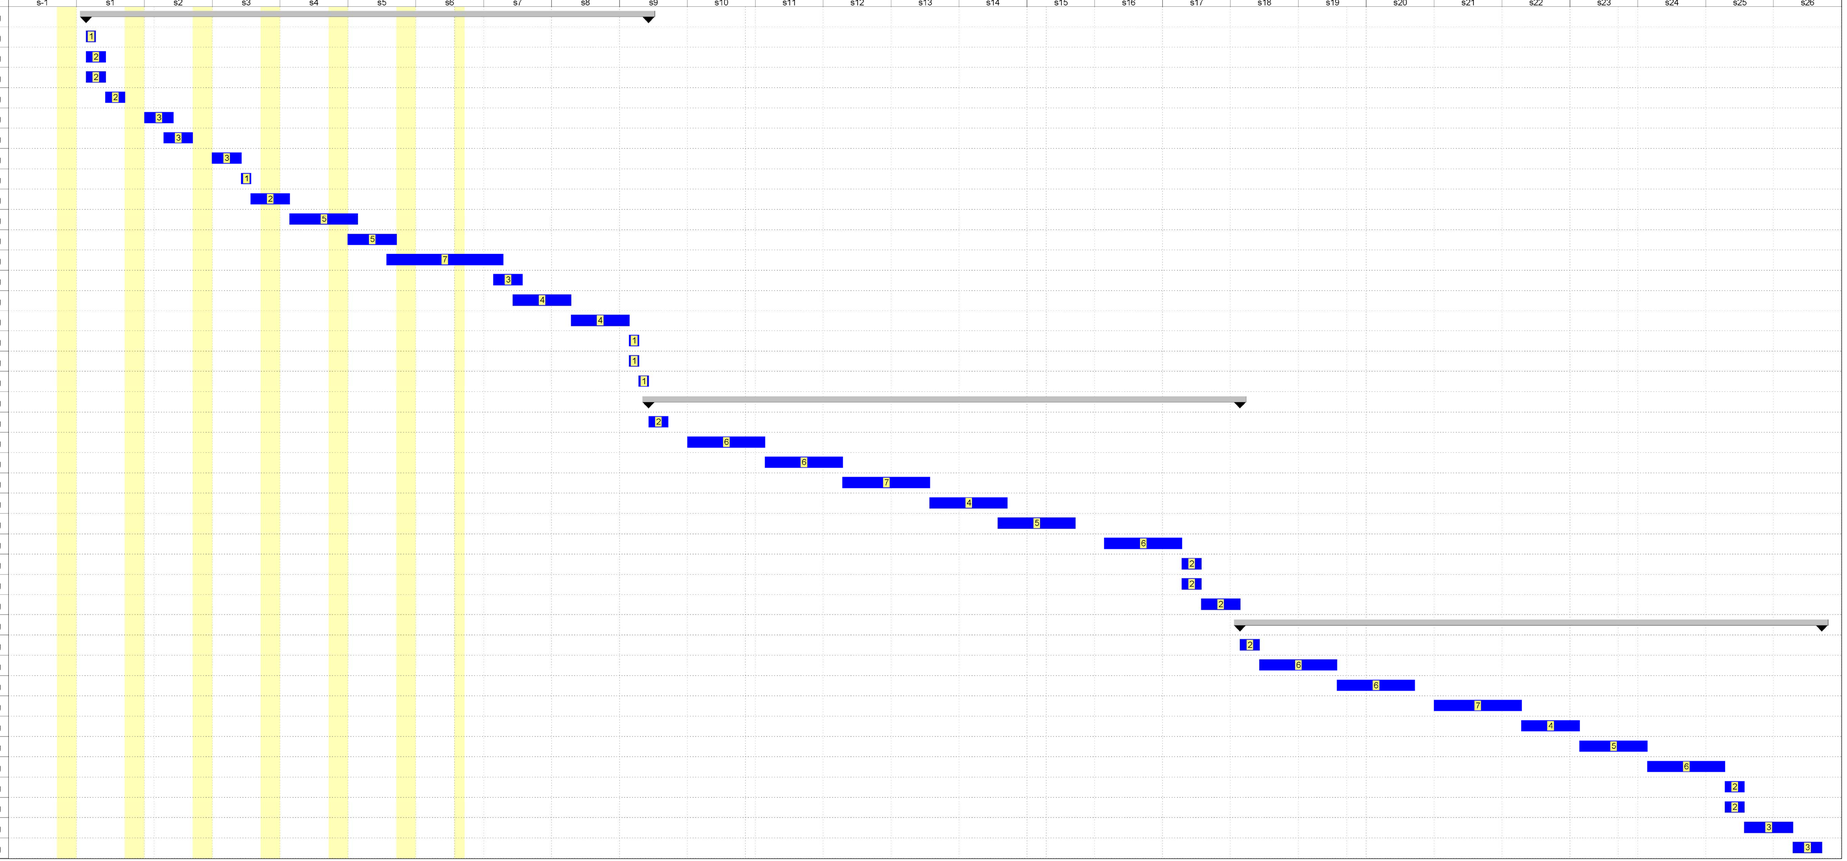
Nome attività	Durata
fase 1 - tratto cervino-valprato	41 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Smontaggio di guard-rails	2 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori	3 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g
Formazione di rilevato stradale	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Posa di tubazione in PVC interrata	5 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g
Formazione di fondazione stradale	3 g
Realizzazione di marciapiedi	4 g
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g
Posa di segnali stradali	1 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g
Formazione di tappeto erboso	1 g
fase 2 - tratto villar-breglio	39 g
Formazione di rilevato stradale	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6 g
Posa di tubazione in PVC interrata	6 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g
Formazione di fondazione stradale	4 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g
Posa di segnali stradali	2 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g
Formazione di tappeto erboso	2 g
fase 3 - piazzale rebaudengo	44 g
Formazione di rilevato stradale	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6 g
Posa di tubazione in PVC interrata	6 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g
Formazione di fondazione stradale	4 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g
Posa di segnali stradali	2 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g
Formazione di tappeto erboso	3 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
